

附件 1:

2014 年度江苏省水泥物理性能检测能力验证结果汇总表
(A 样)

序号	单位名称	是否具有 资质	样品 编号	Z 值									结 果
				细度	密度	比表面积	标准稠度 用水量	初凝 时间	终凝 时间	胶砂 流动度	3 天抗折 强度	3 天抗压 强度	
1	高淳县建程工程质量检测有限公司	是	6	0.39	-0.54	-0.14	0.34	-0.29	0.19	0.92	0.45	0.86	满意
2	宿迁栳弘建筑工程技术服务有限公司	是	7	0.39	0.54	0.20	1.35	0.67	0.67	-0.84	-1.80	-2.82△	可疑
3	南通正信工程质量检测有限公司	是	8	-0.58	-1.08	0.18	0.34	-2.70▲	-2.31▲	-4.31★	0.90	0.61	可疑
4	吴江市东南建筑检测有限公司	是	9	0.58	0.54	0.66	0.67	1.06	0.67	0.40	-2.25△	-1.10	可疑
5	滨海县建设工程质量检测中心	是	10	无资质	无资质	无资质	-1.01	0.67	-0.19	-1.28	0.00	0.25	满意
6	仪征市建设工程质量检测中心	是	21	-0.39	-1.62	-0.07	0.67	-0.39	0.58	-0.48	-0.45	0.61	满意
7	无锡市锡山区建筑工程质量检测中心	是	22	-0.77	无资质	无资质	-0.34	-0.87	0.77	-1.28	-1.80	-2.70△	可疑
8	泰州市中度工程质量检测有限公司	是	23	-0.19	2.16▲	1.51	0.00	-0.77	-0.67	-0.62	2.25△	1.23	可疑
9	常州市建筑科学研究院股份有限公司	是	24	1.16	-0.54	0.34	-0.67	-1.64	1.35	3.67★	0.45	-3.92☆	不满意
10	苏州科建建设工程质量检测有限公司	是	25	-0.39	0.00	1.66	0.67	1.16	0.19	-0.29	-2.25△	0.86	可疑
11	江阴市建设工程质量检测中心	是	36	0.39	-1.08	-2.39▲	-0.34	-1.45	-1.93	0.73	0.00	-0.12	满意
12	江苏瑞元建设工程检测有限公司	是	37	-0.58	1.62	1.96	1.35	0.10	0.39	0.00	2.25△	1.59	可疑
13	江苏科永和工程建设质量检测鉴定中心有限公司	是	38	-0.77	0.54	-0.73	-0.34	0.29	-0.19	0.20	0.45	1.59	满意

14	海安县恒源建设工程质量检测有限公司	是	39	-1.93	2.70▲	-1.15	-1.69	0.00	-0.48	0.55	0.00	0.74	满意
15	如皋市永诚建设工程检测有限公司	是	40	-1.16	0.54	1.02	0.34	2.60▲	1.64	-2.42▲	-0.90	0.61	满意
16	南京市房建工程检测中心试验室	是	51	0.77	1.08	-0.08	1.01	0.00	0.39	-0.53	0.90	2.08△	可疑
17	镇江金航工程检测有限公司	是	53	12.33★	2.16▲	-6.95★	-1.01	-0.29	-0.77	-1.14	-1.35	0.37	可疑
18	江苏元测工程技术有限公司	是	54	-0.58	-0.54	0.53	-0.34	0.00	-0.77	-0.64	0.90	2.58△	可疑
19	高新区建设工程质量检测有限公司	是	55	-1.54	-0.54	1.97	-0.34	0.29	-0.10	-4.40★	0.45	0.37	可疑
20	江苏江南检测有限公司	是	66	-0.58	-0.54	-1.21	-0.67	-0.10	-0.58	-1.01	0.45	-0.12	满意
21	江苏乾正建设工程质量检测有限公司	是	67	-2.51▲	2.70▲	-2.81▲	-1.01	-2.51▲	1.06	-0.37	0.90	2.33△	可疑
22	昆山正信工程技术服务有限公司	是	68	12.91★	1.08	-3.41★	1.01	-0.48	0.19	-0.22	-0.90	0.25	可疑
23	南京新安信建筑工程质量检测中心	是	69	-1.16	0.00	1.69	0.34	-4.53★	-2.89▲	0.09	0.00	0.49	可疑
24	江苏省水利建设工程质量检测站	是	70	-0.77	-3.24★	-1.50	2.36	-3.28★	3.47★	-0.46	0.45	1.35	可疑
25	宿迁市建设工程质量检测中心有限公司	是	81	-0.77	1.62	0.99	0.00	-2.51▲	-0.48	-1.76	0.45	-0.12	满意
26	淮安天地工程检测有限公司	是	82	-0.58	1.08	1.79	-0.67	0.87	2.02▲	0.92	-0.45	-1.72	满意
27	南通市建设工程质量检测站有限公司	是	83	-0.96	-1.08	-0.05	-0.34	-3.57★	-2.22▲	-0.26	0.45	-0.12	可疑
28	相城区建设工程质量检测中心	是	84	1.16	-0.54	-0.48	0.00	0.77	0.29	0.51	-0.45	-0.12	满意
29	常州华夏建设工程质量检测有限公司	是	85	0.58	-1.08	-0.51	-0.34	-0.87	0.29	0.53	0.90	-0.12	满意
30	南京建正建设工程质量检测中心	是	96	1.35	0.54	-0.37	-0.67	-0.10	0.77	3.23★	0.45	1.47	可疑
31	无锡市建衡工程质量检测有限公司	是	97	0.58	-0.54	0.30	0.00	0.19	0.67	-0.13	0.00	-0.37	满意
32	苏州工业园区建设工程质量检测咨询服务有限公司	是	98	0.77	0.00	-0.22	-0.34	0.48	0.29	0.24	-1.35	0.61	满意
33	南通市通佳工程质量检测有限公司	是	99	-0.96	-0.54	-0.11	-1.01	-1.54	-0.58	-0.44	1.35	-0.61	满意

34	东台市建设工程质量检测有限公司	是	100	0.77	-1.08	0.21	0.00	-0.29	0.19	-0.18	0.90	1.59	满意
35	盐城市禹衡建铸工程质量检测有限公司	是	111	0.39	-0.54	-1.21	1.35	-1.73	-2.22▲	-0.09	1.35	-0.98	满意
36	江苏大学土木工程技术研究院有限公司	是	112	53.77★	2.16▲	-2.77▲	0.34	0.87	-1.73	-3.19★	-0.90	1.35	可疑
37	泰州市天衡建设工程质量检测有限公司	是	113	-1.16	-0.54	-5.10★	1.01	0.67	0.48	-3.08★	-0.90	0.49	可疑
38	溧水县建筑安装工程质量检测中心	是	114	-0.58	-1.08	-1.61	1.35	1.64	-0.58	-1.25	-0.45	-0.37	满意
39	宜兴市土木建设工程质量检测有限公司	是	115	-0.58	0.54	-0.37	-1.01	-0.29	-1.25	0.55	-1.35	0.37	满意
40	新沂市盛丰建设工程检测中心	是	126	-0.39	0.54	1.14	0.00	0.19	0.19	0.55	0.45	-0.12	满意
41	昆山开发区建设工程检测有限公司	是	127	1.16	0.00	0.57	0.67	0.39	-0.10	-0.20	0.00	-0.61	满意
42	南通建威建设工程质量检测有限公司	是	128	0.39	0.00	1.02	-1.01	0.67	-0.29	-3.82★	-1.80	0.74	可疑
43	金湖县金桥建筑材料检测有限公司	是	129	0.58	-1.08	-0.63	-1.35	0.87	1.64	3.73★	-0.90	-2.08△	可疑
44	盐城科盛工程检测有限公司	是	130	0.58	-0.54	1.74	0.34	0.48	-0.10	-0.44	-1.35	0.37	满意
45	泰州市恒信建设工程质量检测有限公司	是	161	无资质	无资质	无资质	2.36▲	-0.58	-2.70▲	0.40	0.00	0.12	满意
46	泗洪华晨工程质量检测有限公司	是	162	0.19	-1.08	0.33	0.67	-0.77	-0.48	0.95	0.45	-0.61	满意
47	南京市水利建筑工程检测中心	是	163	-0.39	1.08	-0.51	-2.36▲	-0.29	-0.77	-0.92	-0.45	-1.10	满意
48	贾汪建设工程检测中心	是	164	-0.77	1.08	0.18	2.70▲	-1.93	-0.87	2.79▲	-1.35	-1.23	满意
49	常州正信建设工程检测有限公司	是	165	1.35	0.00	0.21	-0.67	0.19	-1.16	2.02▲	3.15☆	6.74☆	不满意
50	扬州市江都区建筑工程质量检测中心	是	176	0.00	0.54	3.19★	0.34	-4.63★	-3.18★	2.39▲	0.00	1.72	可疑
51	徐州明正建筑材料试验检测中心	是	177	-1.35	-0.54	0.64	-1.35	-4.43★	-0.10	2.94▲	0.00	2.82△	可疑
52	南京沿江工业开发区建筑安装工程质量检测中心	是	178	0.39	-1.62	0.64	0.00	0.19	-0.77	0.00	0.00	-0.25	满意
53	常熟市宏鑫工程质量检测有限公司	是	179	-0.96	-0.54	-2.44▲	1.35	1.64	1.64	0.73	0.45	0.12	满意

54	苏州砼水泥制品研究院检测中心	是	180	0.58	-0.54	0.08	-1.01	1.06	0.67	-0.51	0.00	-0.37	满意
55	镇江市精业工程检测有限公司	是	186	-2.51▲	-1.08	-0.34	-0.67	0.96	0.19	2.13▲	3.60☆	-2.08△	不满意
56	建湖县建设工程质量检测中心	是	187	0.39	-1.62	0.48	1.01	0.00	-0.48	0.17	1.35	2.08△	可疑
57	海门市建设工程质量检测中心	是	188	0.39	-1.08	-1.08	2.36▲	0.58	0.19	0.59	0.00	-0.61	满意
58	苏州水利工程质量检测中心有限公司	是	189	1.16	0.00	0.04	-0.34	0.29	0.67	1.98	-0.45	-0.98	满意
59	无锡市湖滨建设工程检测站	是	190	-0.39	0.00	1.25	-0.67	-0.19	-0.29	0.18	-0.45	-0.74	满意
60	江苏方建工程质量鉴定检测有限公司	是	201	1.93	1.08	0.35	1.01	0.87	1.35	-0.51	-1.35	0.37	满意
61	南京尊计工程检测有限公司	是	202	0.19	0.54	-0.89	0.34	0.00	0.00	0.00	1.80	2.70△	可疑
62	徐州市正源水利建筑工程检测中心	是	203	-1.16	0.00	1.80	3.04★	2.31▲	1.45	3.30★	1.35	0.25	可疑
63	灌南县宏远建筑工程质量检测中心	是	204	1.54	无资质	无资质	-1.35	-0.58	-1.64	-1.38	0.45	0.00	满意
64	涟水县建设工程质量检测中心	是	205	0.77	-1.62	0.33	0.00	0.58	-0.29	-0.37	-1.35	-0.25	满意
65	淮安区建设工程质量检测中心	是	216	0.19	0.00	-2.13▲	0.00	0.58	0.00	0.59	0.90	0.00	满意
66	盐城百信工程质量检测有限公司	是	217	0.39	-0.54	-1.82	-0.34	-1.06	-1.16	0.55	-0.90	0.12	满意
67	江苏中核华兴工程检测有限公司	是	218	-0.77	1.08	1.29	-1.35	0.67	-0.29	2.75▲	1.80	-1.23	满意
68	兴化市建达工程质量检测有限公司	是	219	-2.31▲	3.24★	-0.51	5.73★	-5.11★	6.46★	-4.04★	5.85☆	-1.35	不满意
69	江苏恒达工程检测有限公司	是	220	-0.96	0.54	-0.18	-0.34	2.99▲	2.51▲	0.92	1.35	0.86	满意
70	理工大学工程兵学院南京建材结构试验中心	是	231	0.00	1.08	无资质	2.02▲	0.96	2.79▲	-1.84	0.00	-0.61	满意
71	无锡公建工程质量检测有限公司	是	232	-0.39	3.78★	0.53	-1.01	1.16	2.12▲	4.77★	-2.25△	-1.59	可疑
72	常州常工院建设工程质量检测所有限公司	是	233	0.58	0.54	-1.92	-0.34	-0.48	-0.48	0.73	-0.90	1.35	满意
73	张家港市建设工程质量检测中心	是	234	-0.77	-2.70▲	-1.19	-2.36▲	0.19	-1.25	1.32	-0.45	-0.37	满意

74	启东誉佳市政试验有限公司	是	235	-0.39	-1.08	-3.20★	-2.36▲	3.08★	4.05★	0.64	-0.90	-0.61	可疑
75	邳州市正本建设工程质量检测中心	是	246	4.63★	-1.08	0.33	0.00	3.18★	4.91★	-0.20	-0.90	-2.21△	可疑
76	太仓市创新建筑技术研究有限公司	是	247	0.19	0.54	-0.04	0.00	-0.29	-0.39	-0.35	-0.45	-0.49	满意
77	南通大瑞建设工程质量检测有限公司	是	248	1.54	2.70▲	2.67▲	-0.34	1.16	1.64	1.54	-0.45	0.12	满意
78	连云港市建设工程质量检测中心有限公司	是	249	-0.39	-0.54	1.86	-0.34	-1.06	-0.67	-0.18	0.00	0.74	满意
79	扬州科建建设工程质量安全检测有限公司	是	250	-1.54	0.00	0.33	-0.34	-0.10	-1.06	0.95	0.45	-1.59	满意
80	南京工大建设工程技术有限公司	是	256	-1.54	-2.16▲	-0.43	-0.67	-0.29	0.67	4.85★	0.00	-0.86	可疑
81	盐城市建设工程质量检测中心有限公司	是	257	0.77	-1.08	-0.17	0.34	-0.29	-0.67	0.22	-1.80	-0.25	满意
82	南京市建筑工程学校建材试验中心	是	258	1.35	0.54	-0.22	1.01	0.10	0.29	-1.19	0.45	-0.37	满意
83	扬州市伟业市政公用工程质量检测有限公司	是	260	-1.16	1.62	2.76▲	-0.34	-0.77	0.67	1.36	-2.25△	2.08△	可疑

注：▲ 表示检测机构结果为可疑（除强度外）。

★ 表示检测机构结果为不满意（除强度外）。


△ 表示检测机构强度检测结果为可疑。

☆ 表示检测机构强度检测结果为不满意


A 样 主要稳健统计参数汇总表

项目	细度	密度	比表面积	标准稠度 用水量	初凝时间	终凝时间	胶砂流动度	3 天抗折强度	3 天抗压强度
结果数	81	79	78	83	83	83	83	83	83
中位值	0.38	3.04	376.55	27.9	173	228	205	5.5	27.3
四分一值	0.34	3.025	371.675	27.7	166	221	202.15	5.3	26.8
四分三值	0.41	3.050	381.0	28.1	180	235	209.5	5.6	27.9
四分位距	0.07	0.025	9.325	0.4	14	14	7.35	0.3	1.1
标准化四分位距	0.052	0.019	6.913	0.297	10.378	10.378	5.449	0.222	0.815
稳健 CV (%)	13.656	0.610	1.836	1.063	5.999	4.552	2.658	4.043	2.987
极大值	3.17	3.11	398.6	29.6	206	295	231.4	6.8	32.8
极小值	0.25	2.98	328.5	27.2	120	195	181.0	5.0	24.1
变动范围	2.92	0.13	70.1	2.4	86	100	50.4	1.8	8.7


z比分数直方图-项目：细度 样品：A样

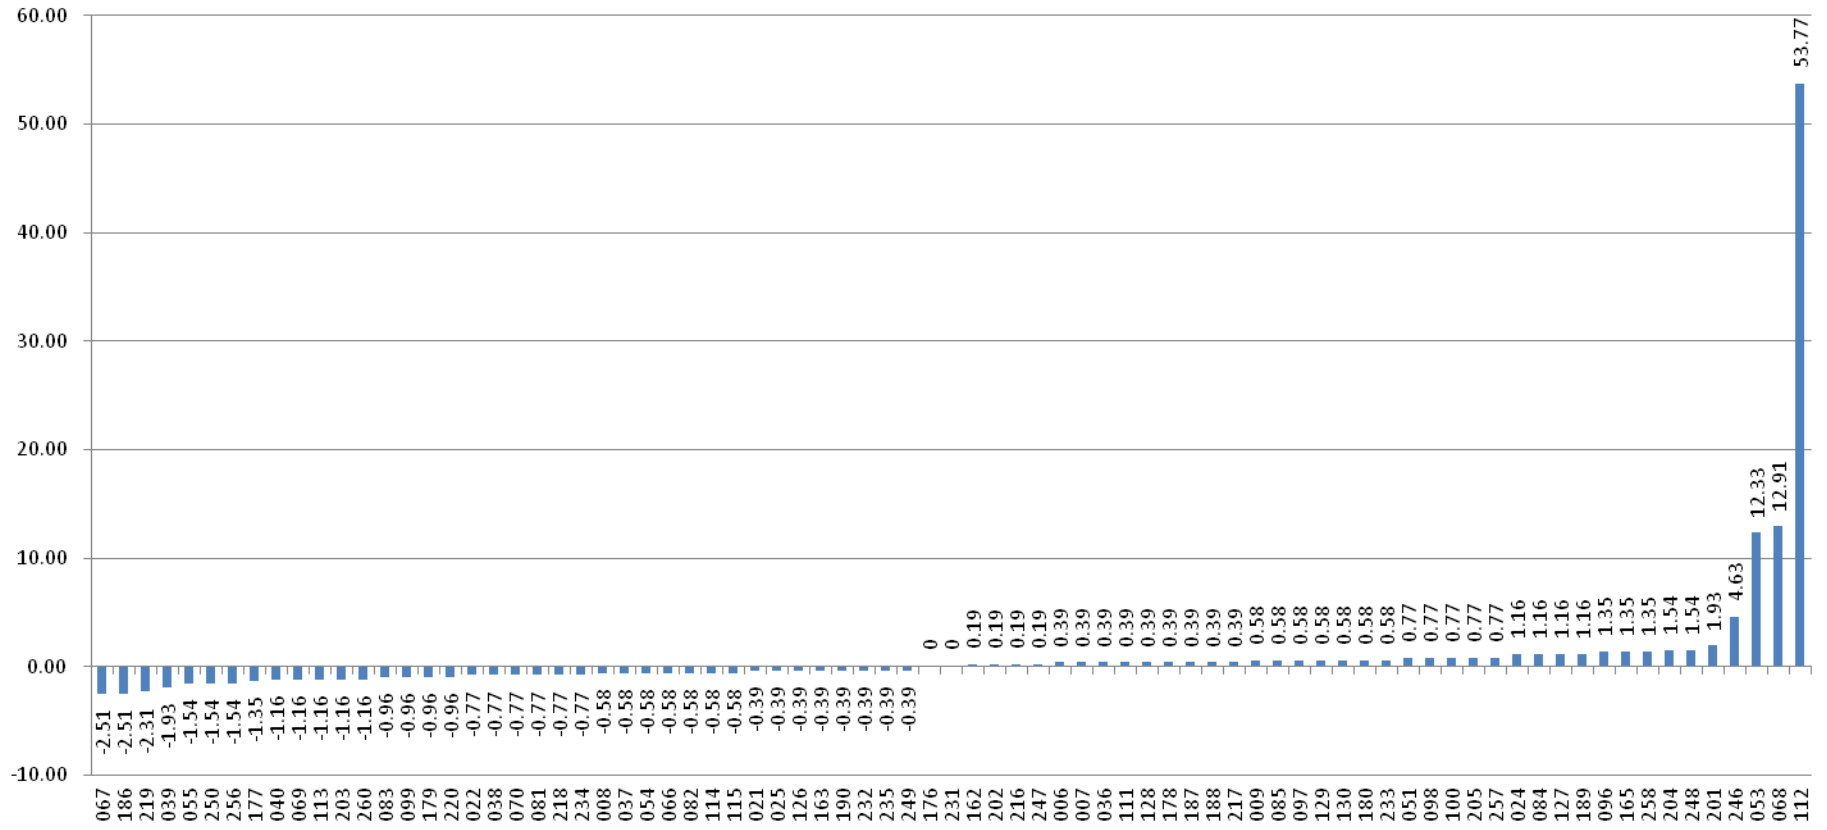


z比分数直方图-项目: 密度 样品: A样

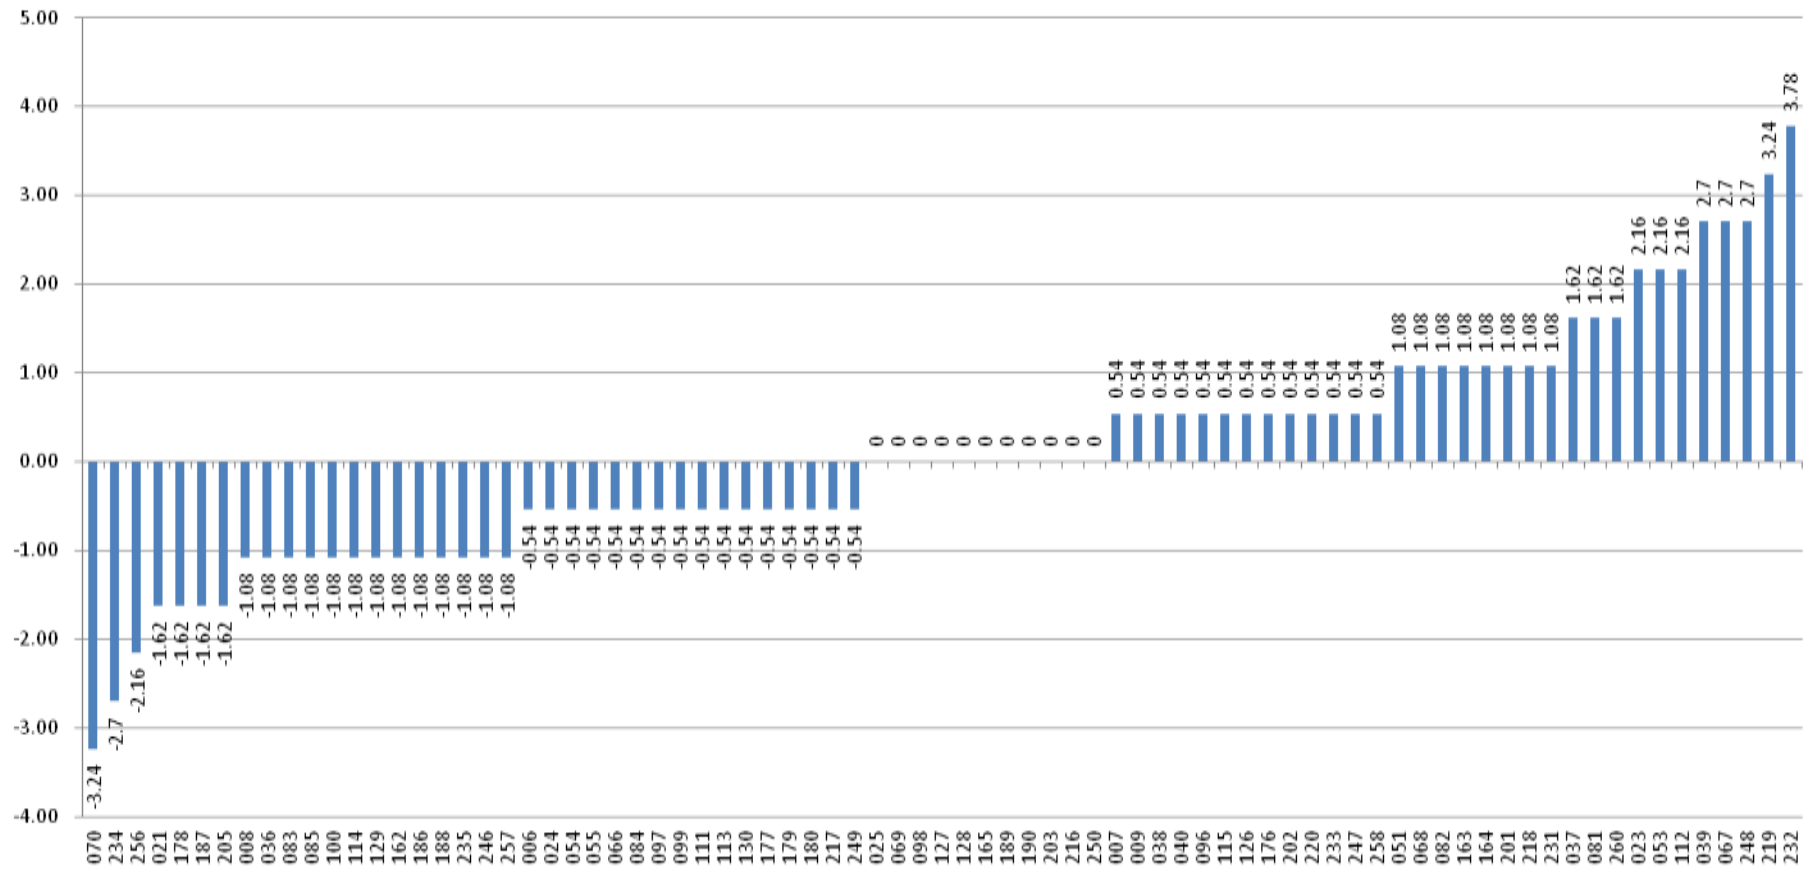


z比分数直方图-项目：比表面积 样品：A样

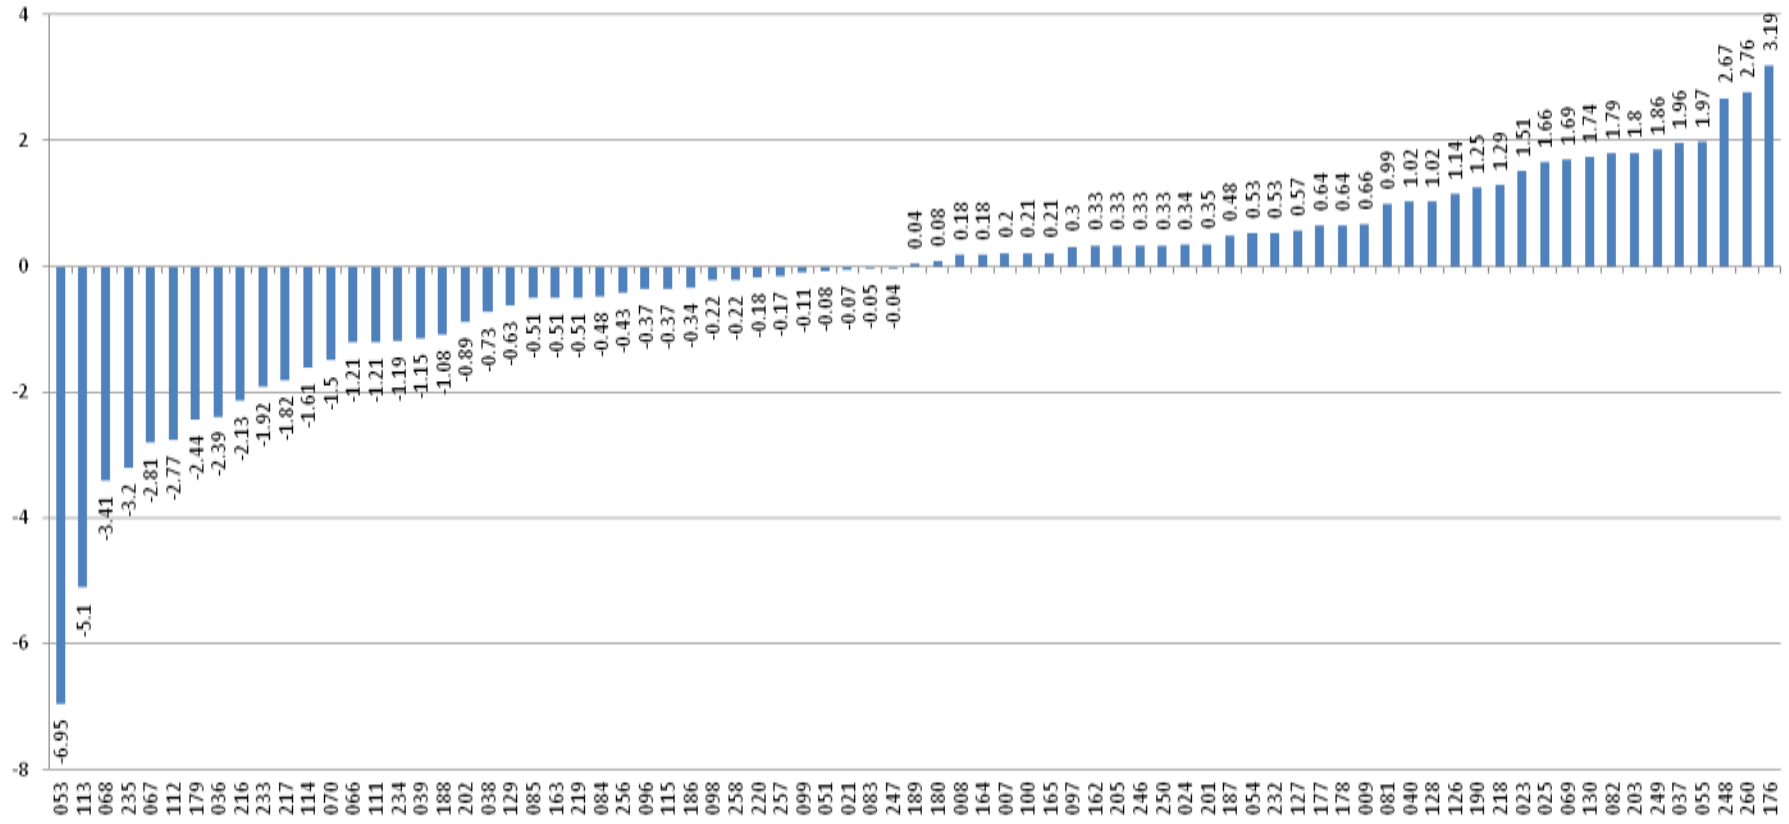


z比分数直方图-项目：标准稠度用水量 样品：A样

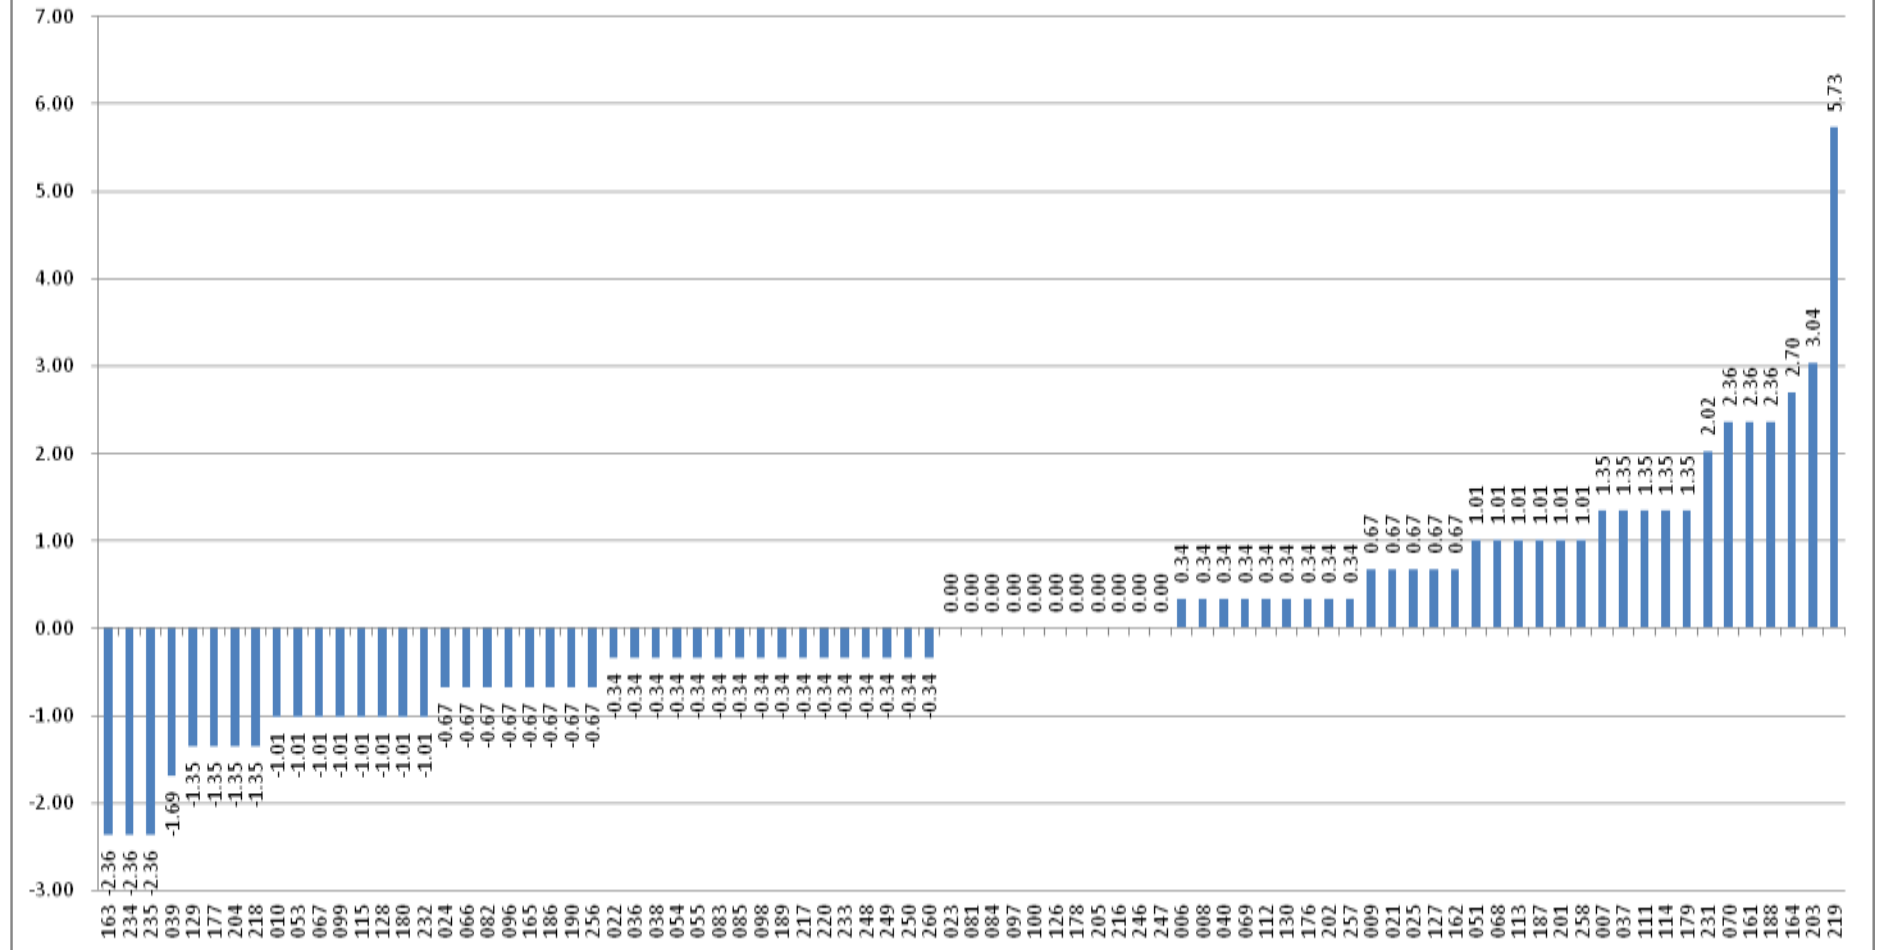


z比分数直方图-项目：初凝时间 样品：A样

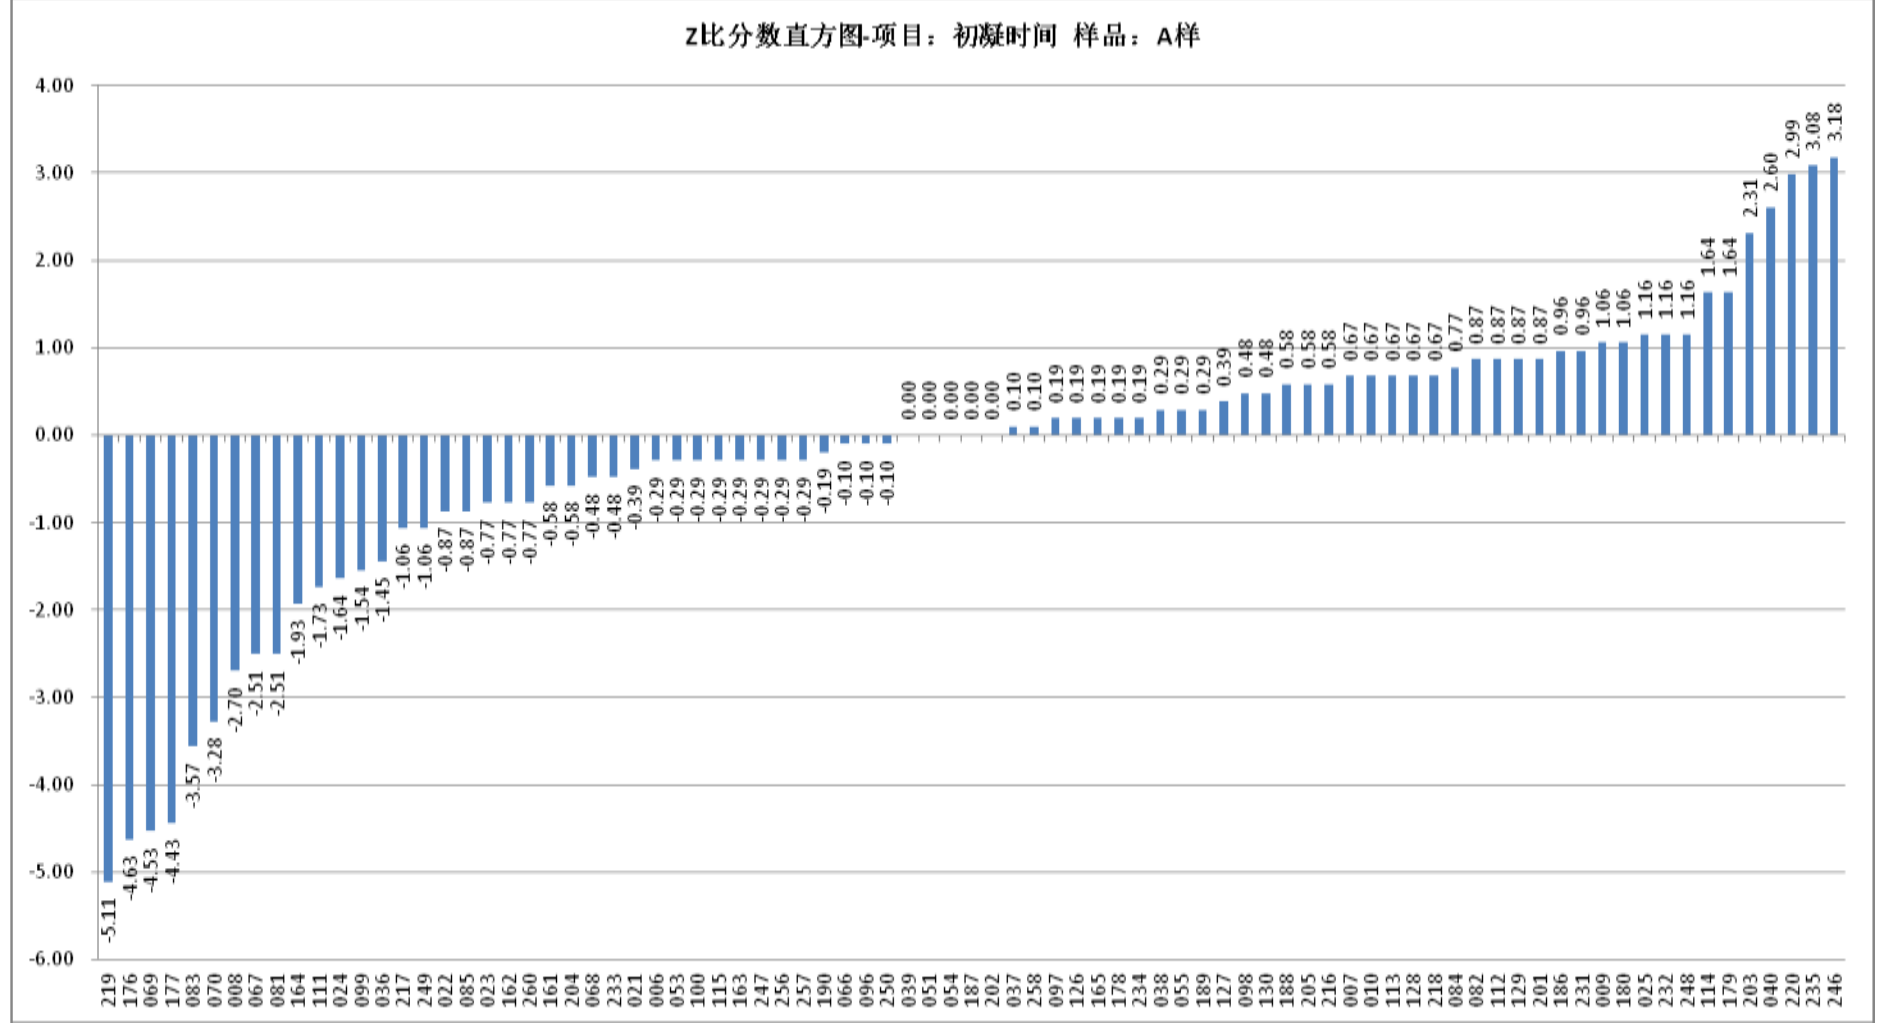


z比分数直方图-项目：终凝时间 样品：A样

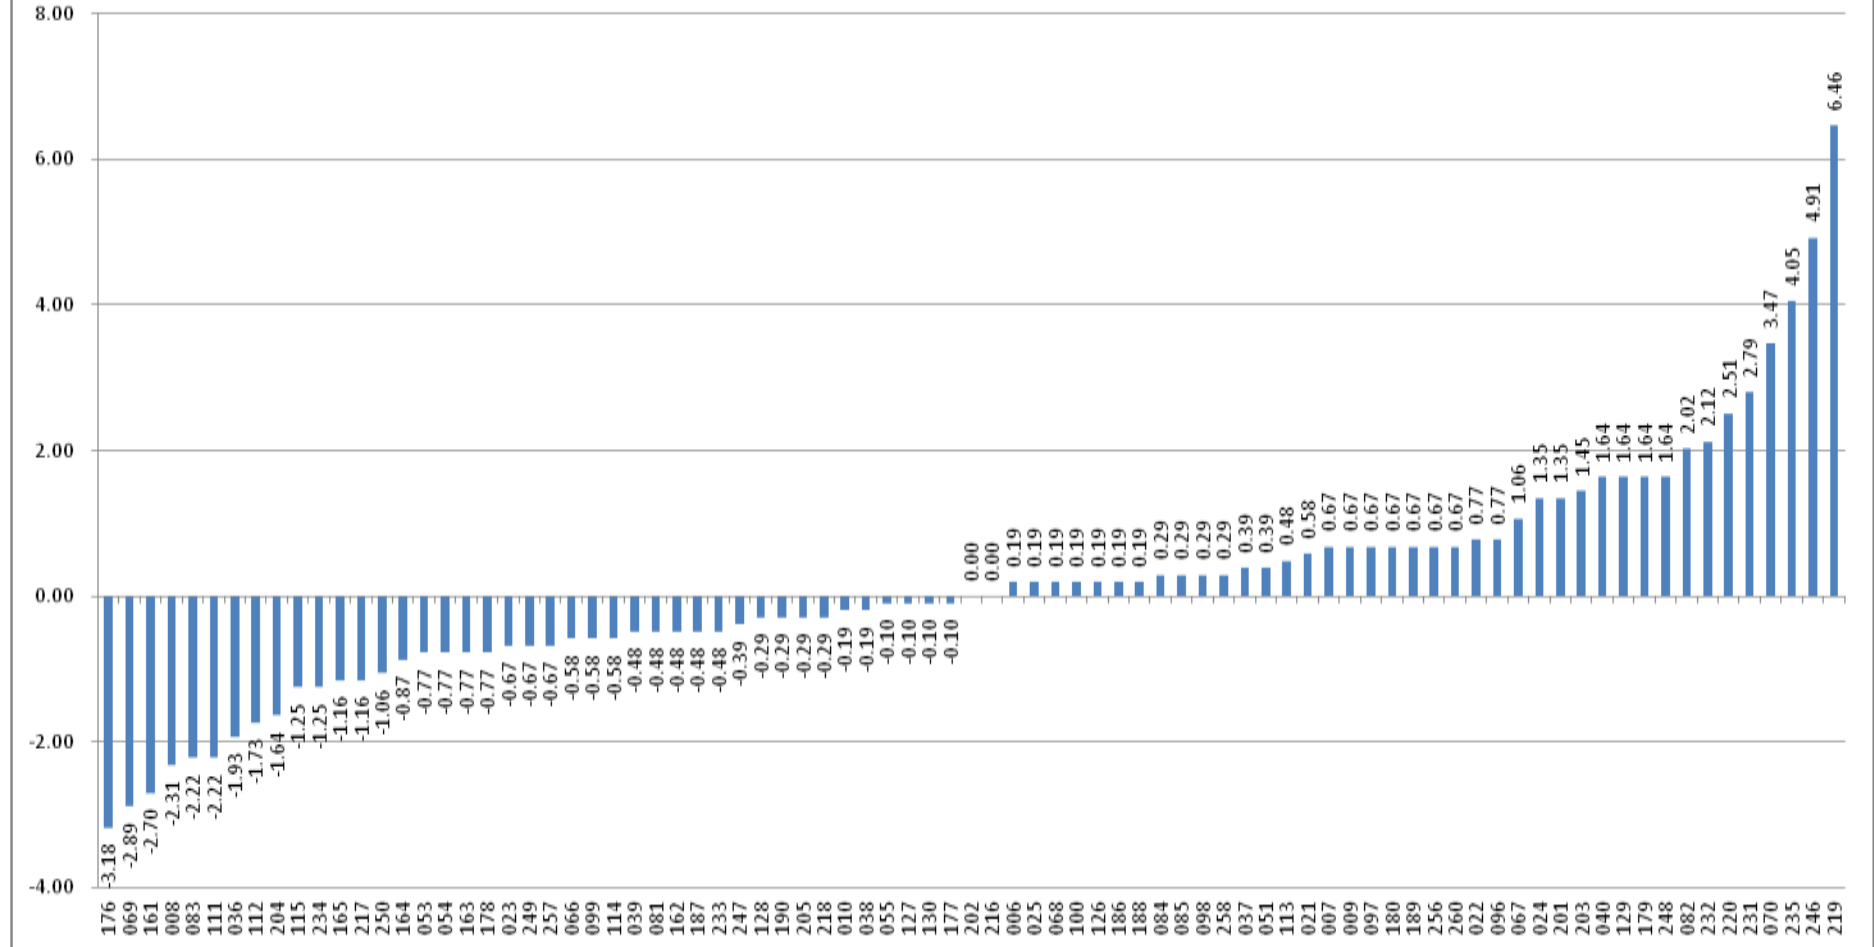


z比分数直方图-项目：胶砂流动度 样品：A样

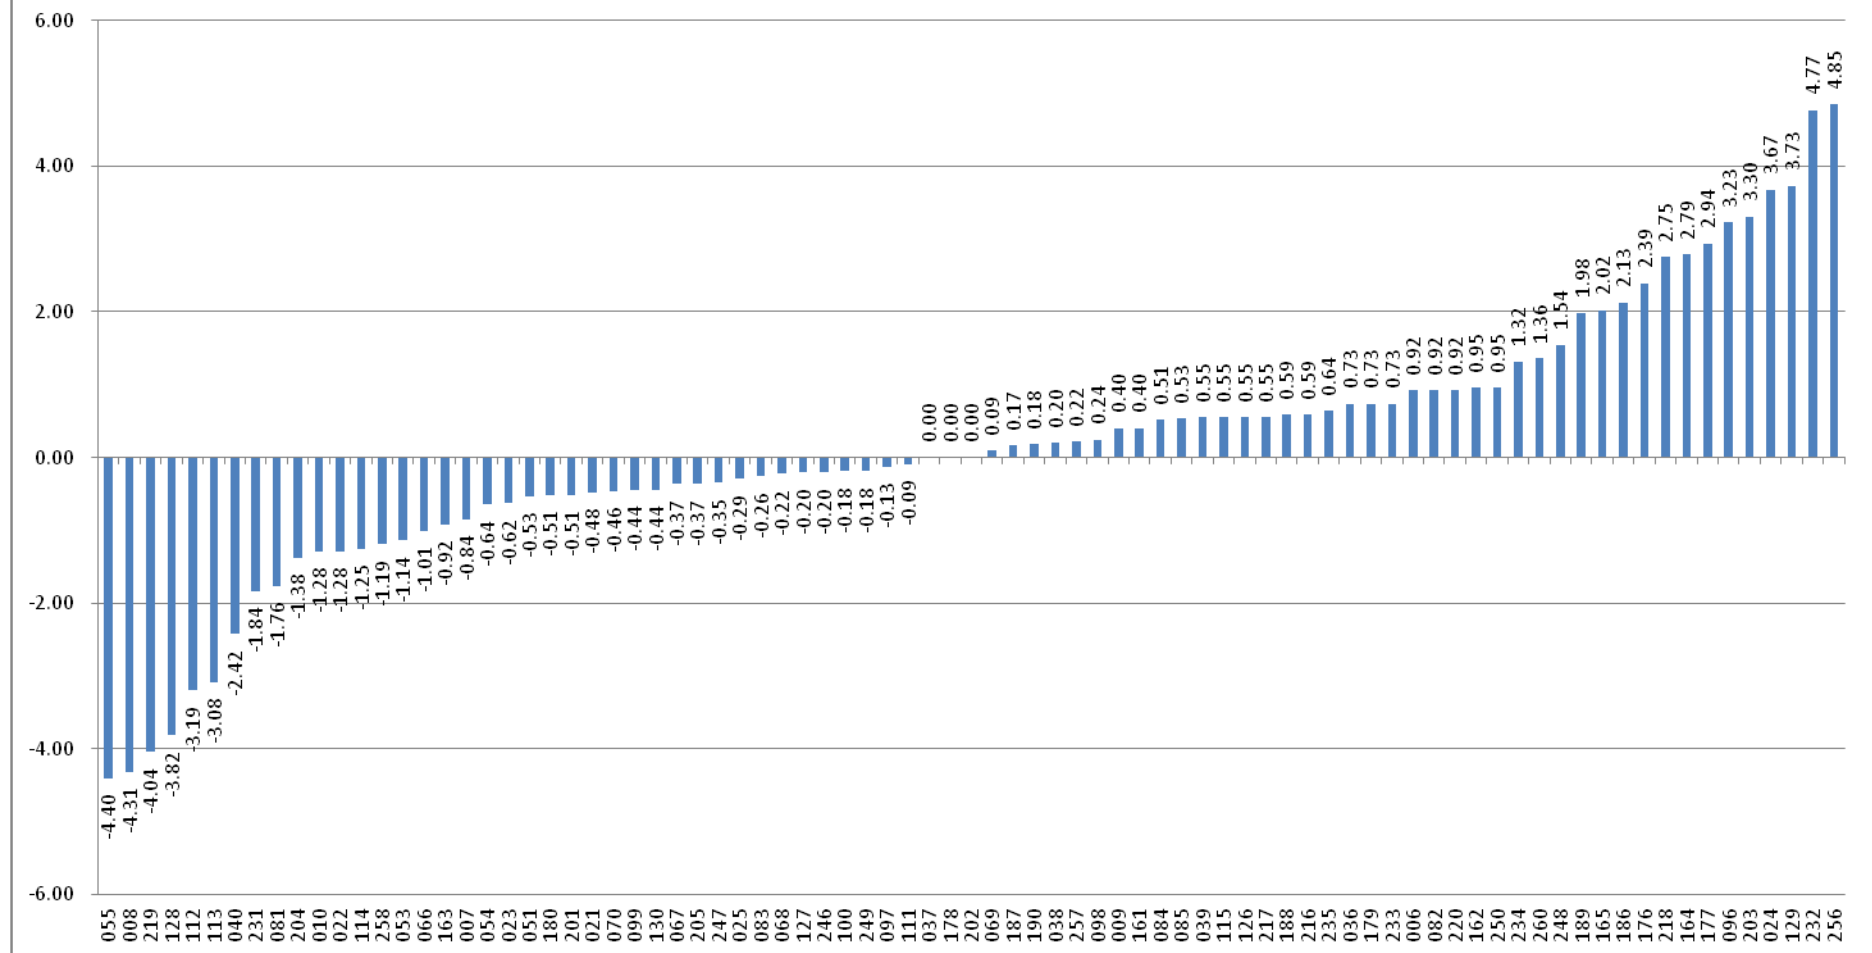

z比分数直方图-项目：3天抗折强度 样品：A样

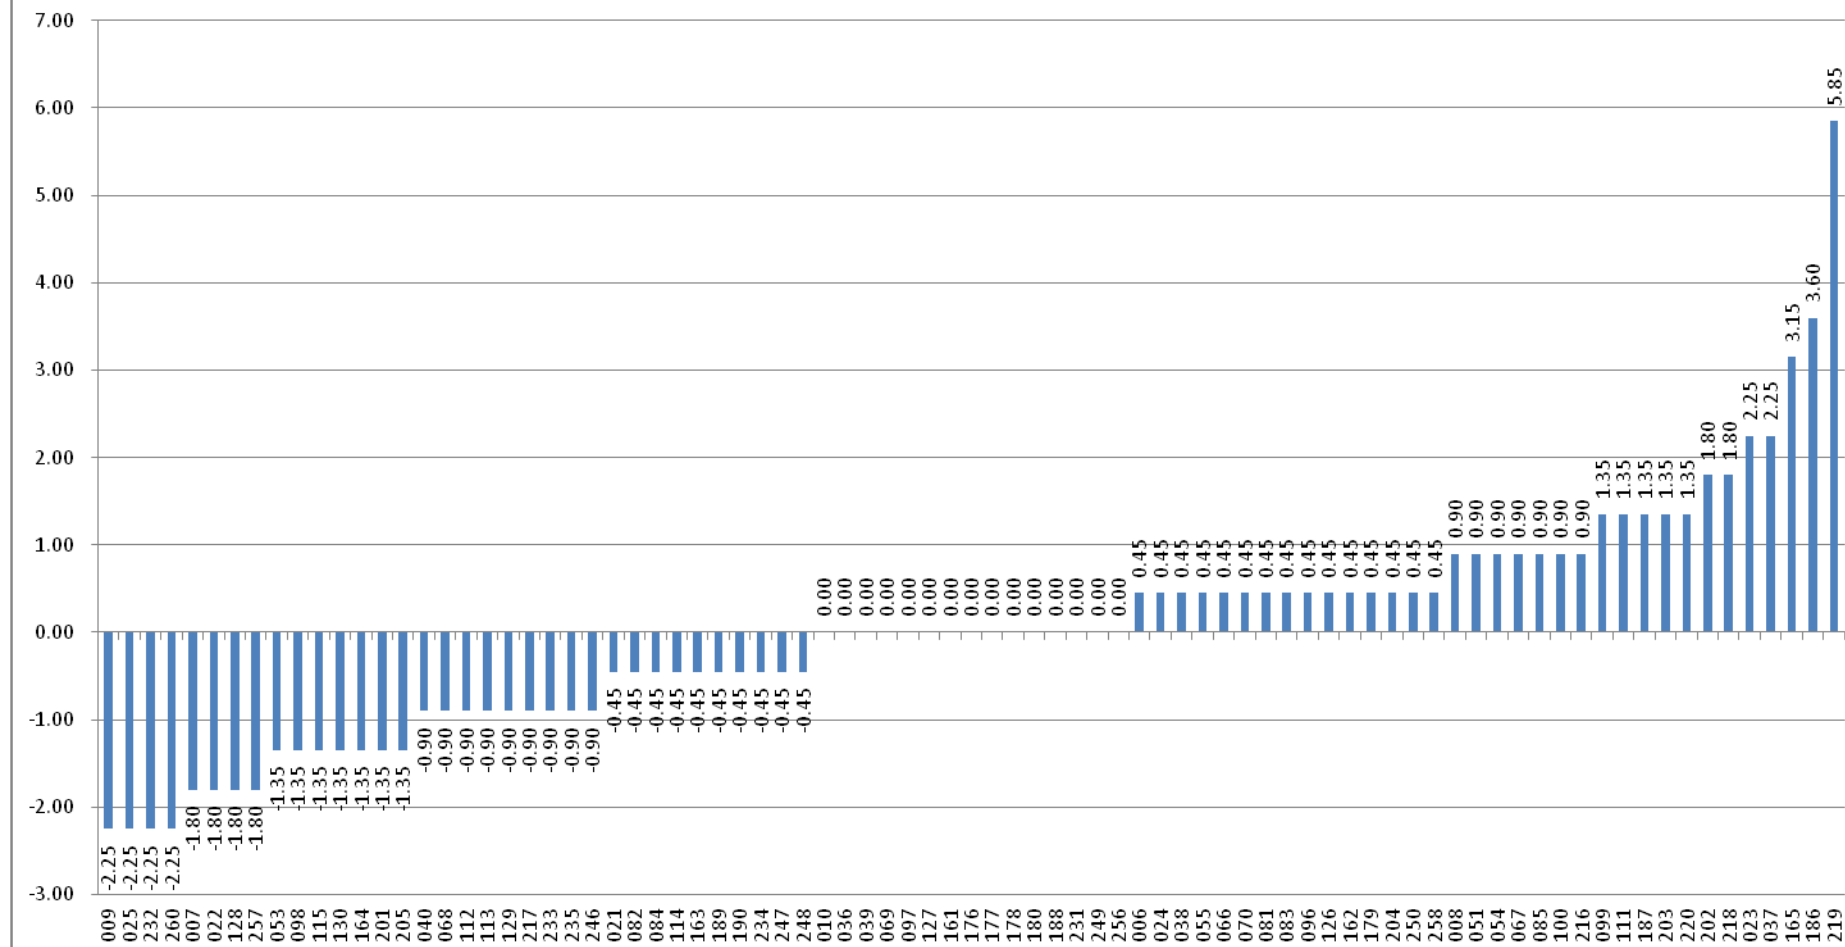

z比分数直方图-项目：3天抗压强度 样品：A样

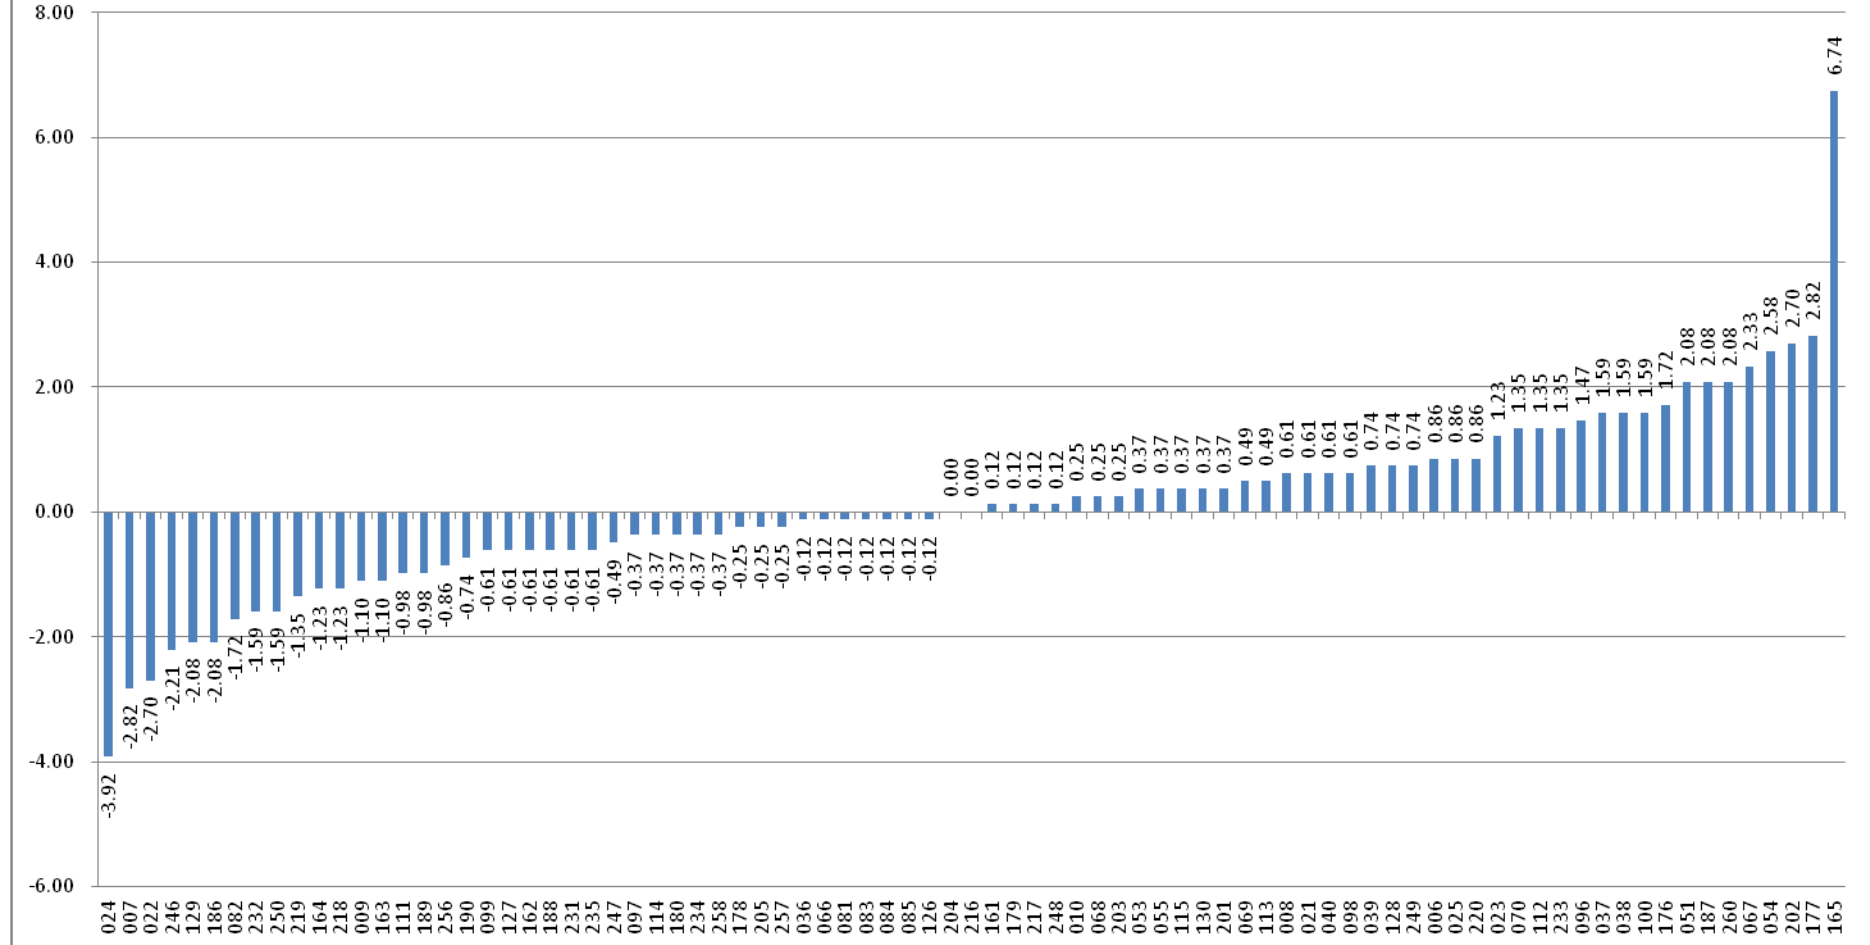

2014 年度江苏省水泥物理性能检测能力验证结果汇总表
(B 样)

序号	单位名称	是否具有资质	样品编号	Z 值									结 果
				细度	密度	比表面积	标准稠度用水量	初凝时间	终凝时间	胶砂流动度	3 天抗折强度	3 天抗压强度	
1	国土资源部南京矿产资源监督检测中心	是	11	1.08	2.70▲	1.15	1.25	0.22	2.33▲	0.00	2.02△	2.58△	可疑
2	宿迁市永春市政工程质量检测有限公司	是	12	-2.16▲	1.35	-4.48★	0.00	-3.15★	0.00	-0.47	2.02△	0.86	可疑
3	射阳县建设工程质量检测中心	是	13	-0.54	0.00	-5.98★	0.42	3.71★	1.96	2.53▲	4.05☆	3.07☆	不满意
4	常州市建筑材料研究所有限公司	是	14	1.08	-1.35	0.07	-0.83	0.90	-1.10	-0.34	0.67	0.25	满意
5	如皋市建筑工程质量检测中心	是	15	0.54	0.00	0.66	0.00	0.56	0.00	-0.13	0.00	0.00	满意
6	宿迁市建科工程质量检测有限公司	是	26	-0.54	0.00	-1.60	0.42	0.67	0.25	-0.67	2.70△	4.05☆	不满意
7	阜宁县建筑工程质量检测中心有限公司	是	27	-3.51★	0.67	1.04	未换算，判为不满意★	1.24	0.00	-3.75★	-2.02△	-10.42☆	不满意
8	中国建材检验认证集团江苏有限公司	是	28	0.00	0.00	0.35	-0.42	-0.79	-0.86	0.67	0.00	0.00	满意
9	江苏三阳建设工程检测有限公司	是	29	0.54	-0.67	0.01	-1.25	0.00	-0.49	0.25	0.00	0.00	满意
10	江苏华科建设工程质量检测有限公司	是	30	0.27	-1.35	-0.53	-0.42	0.22	0.61	0.71	1.35	0.00	满意
11	苏州东吴建设工程质量检测有限公司	是	56	0.00	-5.40★	-2.10▲	0.42	0.00	0.61	-1.38	-4.05☆	-2.08△	不满意
12	南通天和建设工程质量检测有限公司	是	57	1.89	-2.70▲	-0.44	3.32★	-0.34	-0.37	1.23	0.67	0.00	可疑
13	连云港市经济技术开发区建设工程检测中心有限公司	是	58	0.00	-2.02▲	0.85	0.00	-1.57	-0.74	-1.21	1.35	-1.10	满意

14	盐城圣洁建设工程质量检测有限公司	是	59	-0.27	0.00	1.09	0.83	0.00	0.61	1.07	-0.67	0.61	满意
15	泰州市屹峰建设工程质量检测有限公司	是	60	0.27	0.00	0.40	-1.25	0.34	0.00	-0.49	-4.05☆	-0.49	不满意
16	扬州市建伟建设工程检测中心有限公司	是	71	-1.08	-2.70▲	0.45	0.42	0.90	0.12	-1.34	-1.35	-1.96	满意
17	江苏方正工程检测有限公司	是	72	0.54	33.72★	-5.34★	3.32★	4.50★	9.20★	-4.20★	5.40☆	-5.52☆	不满意
18	苏州新地建设工程质量检测有限公司	是	73	0.54	-0.67	-0.22	-0.42	1.12	0.61	1.05	1.35	1.96	满意
19	溧阳市建设工程质量检测中心	是	74	1.08	1.35	-0.04	0.83	0.56	0.25	0.42	0.67	0.61	满意
20	南京新华泰物探工程测试中心有限公司	是	75	0.00	2.02▲	1.07	0.42	1.12	0.61	-0.85	0.67	0.37	满意
21	江苏省产品质量监督检验研究院	是	86	0.00	1.35	0.43	1.25	0.67	0.74	1.03	0.67	0.61	满意
22	无锡市市政工程质量检测中心	是	87	0.54	0.00	0.64	-0.83	1.12	0.00	0.24	0.00	0.25	满意
23	常熟市苏常工程质量检测有限公司	是	88	19.43★	2.02▲	-2.20▲	-5.81★	3.15★	3.19★	-2.03▲	0.00	-1.10	可疑
24	南通科正工程质量检测有限公司	是	89	0.54	0.00	-0.61	-0.42	-0.45	1.23	1.23	0.67	0.25	满意
25	金湖诺诚工程检测有限公司	是	90	1.08	-1.35	-0.57	0.42	-0.34	0.25	0.40	-1.35	-0.49	满意
26	南京八方建设工程检测有限公司	是	101	0.81	0.00	0.35	0.83	1.12	3.07★	1.07	-5.40☆	-0.98	不满意
27	江阴市中建工程质量检测有限公司	是	102	-1.08	-0.67	0.54	-0.42	-0.56	-0.37	1.12	0.00	0.25	满意
28	徐州大屯技术服务有限公司	是	103	7.82★	5.40★	-1.07	2.91▲	1.46	0.74	3.31★	1.35	-1.10	可疑
29	昆山求正工程质量检测有限公司	是	104	-1.08	0.00	0.43	0.00	-0.56	-1.47	-1.34	0.67	-0.12	满意
30	启东通启工程试验检测有限公司	是	105	2.16▲	2.02▲	0.88	0.42	0.11	-1.10	-0.24	0.00	-0.37	满意
31	泰兴市中兴建设工程质量检测中心有限公司	是	116	-1.08	1.35	-0.24	0.00	0.90	0.25	-0.53	-1.35	-1.10	满意
32	丹阳市建设工程质量检测中心	是	117	-0.54	2.02▲	-0.63	-1.66	-0.56	-1.23	0.60	0.67	0.37	满意
33	盐城市天恒建设工程质量检测有限公司	是	118	-0.54	0.67	-1.08	0.00	0.11	-1.23	-1.65	-0.67	-0.49	满意

34	海安县建筑工程质量检测中心有限公司	是	119	-1.62	1.35	0.01	0.42	-2.25▲	-2.45▲	0.00	0.67	0.25	满意
35	苏州科联建设工程质量检测有限公司	是	120	-0.27	-2.02▲	0.70	-0.83	-1.69	-0.61	2.37▲	-0.67	0.98	满意
36	江苏交科工程检测技术有限公司	是	131	0.54	-0.67	0.31	-0.42	0.34	-0.25	-0.74	1.35	-0.86	满意
37	南京雨花建筑材料检测有限公司	是	132	-0.54	-0.67	-0.08	-0.83	-2.81▲	1.47	0.05	0.67	-10.67☆	不满意
38	常熟市东南工程质量检测有限公司	是	133	-0.27	0.67	-1.81	0.42	-1.69	0.61	1.32	0.00	-0.49	满意
39	张家港市保税区金港建设工程质量检测中心	是	134	-0.27	-1.35	0.10	0.42	0.79	-0.49	1.00	0.67	-3.07☆	不满意
40	连云港蓝翔建设工程质量检测有限公司	是	135	0.00	-0.67	-1.11	0.00	-1.01	-0.37	-0.09	0.67	0.49	满意
41	淮安市柯瑞特建筑工程质量检测有限公司	是	141	1.08	-0.67	1.35	0.00	0.00	0.61	0.80	3.37☆	2.08△	不满意
42	盐城恒信建设工程质量检测有限公司	是	142	-0.27	-2.02▲	1.07	1.66	1.01	0.25	-1.48	-2.02△	-2.21△	可疑
43	扬州弘海建设工程质量安全检测有限公司	是	143	-1.08	-2.70▲	0.16	-0.42	-1.12	-0.74	-0.04	-0.67	-1.84	满意
44	扬中市建设工程质量检测中心	是	144	0.54	0.67	-0.22	0.00	0.00	0.49	1.00	-0.67	0.37	满意
45	江苏房城建设工程质量检测有限公司	是	145	-2.70▲	-0.67	-0.98	2.91▲	0.67	-1.35	0.14	-0.67	-0.74	满意
46	江苏省建筑工程质量检测中心有限公司	是	156	0.00	-0.67	-0.14	0.83	1.12	-0.61	0.27	0.67	0.61	满意
47	南京市市政公用工程质量检测中心站	是	157	-0.27	-0.67	0.48	0.42	-0.22	-0.61	-0.38	0.67	0.00	满意
48	江苏正科工程材料质量检测有限公司	是	158	-0.54	0.00	-0.13	-1.66	-0.79	-2.21▲	0.60	0.00	1.23	满意
49	徐州市宏达土木工程试验室有限责任公司	是	159	0.81	-1.35	-1.44	未换算，判为不满意★	0.22	-0.49	-3.35★	0.00	0.49	可疑
50	江苏科信工程检测有限公司	是	160	0.27	0.00	-0.91		0.22	0.74	-0.81	0.00	0.49	满意
51	沭阳县阳光建设工程质量检测有限公司	是	171	0.81	-0.67	0.81	-1.66	-1.35	-1.23	0.05	0.00	-0.61	满意
52	泰州益泰建设工程检测有限公司	是	172	-0.54	3.37★	0.93	0.83	1.80	0.61	-0.42	-2.70▲	-1.47	可疑

53	扬州市扬大工程检测中心有限公司	是	173	0.00	0.67	1.37	1.25	-2.81▲	1.23	-0.49	0.00	-0.61	满意
54	淮安市建筑工程检测中心有限公司	是	174	-1.08	0.00	0.94	0.83	-1.01	-1.10	-0.85	-0.67	-1.10	满意
55	南通法瑞工程检测有限公司	是	175	0.81	-1.35	-2.33▲	0.00	0.34	0.00	-0.38	1.35	-0.25	满意
56	南京方正建设工程质量检测有限公司	是	191	0.81	-0.67	0.49	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.67	0.00	满意
57	无锡市惠山区安信检测服务有限公司	是	192	0.00	无资质	无资质	0.00	0.56	0.61	-0.43	0.00	0.98	满意
58	常州科鉴建设工程质量检测有限公司	是	193	0.54	无资质	无资质	0.00	-3.93★	-1.23	1.59	1.35	0.12	可疑
59	苏州恒信建设技术开发检测有限公司	是	194	0.54	-0.67	-0.23	-1.25	0.56	0.61	0.18	0.00	0.25	满意
60	南通亿诚建设工程质量检测有限公司	是	195	0.54	1.35	-1.04	-1.66	-2.02▲	-1.10	0.60	1.35	-0.86	满意
61	泰州市金衡建筑材料检测有限公司	是	206	-1.08	2.70▲	0.30	0.00	1.46	1.59	-0.49	-1.35	-2.21△	可疑
62	仪征市四方建设工程质量检测有限公司	是	207	-0.54	-1.35	0.05	0.83	-1.12	-0.61	-0.09	-1.35	-0.25	满意
63	洪泽县建设工程质量检测中心有限公司	是	208	0.81	0.67	-2.02▲	-1.66	-0.56	-0.61	0.63	2.70△	0.98	可疑
64	赣榆县建设工程质量检测中心	是	209	1.62	0.67	-1.68	0.42	0.79	2.21▲	4.58★	-1.35	-1.72	可疑
65	苏州市天平工程检测公司	是	210	-1.89	0.67	-0.97	-0.42	0.79	0.74	0.02	-0.67	0.61	满意
66	南京金墙建筑节能检测有限公司	是	221	-0.27	0.67	-0.32	-0.83	-0.56	-0.61	1.14	0.00	0.74	满意
67	太仓市华兴工程试验检测有限公司	是	223	1.08	0.00	0.43	未换算，判 为不满意★	-1.12	-1.96	-4.20★	-0.67	-0.12	可疑
68	江苏志盛建设工程检测有限公司	是	224	0.27	-2.70▲	-0.08		-0.22	-0.61	-1.76	-2.02△	-1.23	可疑
69	江苏恒祥建设工程质量检测有限公司	是	225	0.00	0.00	0.41	-0.83	-1.01	-1.72	-1.67	0.67	0.49	满意
70	句容市建筑工程质量检测中心	是	236	0.54	0.67	-0.39	-0.83	0.22	-0.74	0.24	0.67	0.25	满意
71	大丰市建设工程质量检测有限公司	是	237	0.00	0.00	1.35	0.42	0.34	0.00	0.05	-0.67	0.00	满意

72	南通市建筑工程质量检测中心	是	238	0.81	-0.67	0.63	0.00	0.00	0.00	-0.42	0.00	0.12	满意
73	吴江市建设工程质量检测中心有限公司	是	239	0.27	-0.67	0.21	-0.83	1.01	0.12	-0.47	0.67	0.61	满意
74	宜兴宏信建设工程质量检测有限公司	是	240	1.08	-0.67	-0.75	-0.83	-1.12	-3.07★	-0.65	0.67	0.00	可疑
75	江苏地质矿产设计研究院	是	251	1.08	0.00	-0.89	1.25	1.01	0.49	-3.48★	1.35	1.35	可疑
76	江苏石油勘探局油田建设处中心试验室	是	253	-0.54	0.00	1.59	1.66	-3.04★	2.70▲	2.23	0.67	-0.25	可疑
77	无锡市恒信工程质量检测有限公司	是	254	-0.81	0.67	-0.17	-1.25	-0.45	-1.35	-1.07	-1.35	-0.49	满意
78	南京栖霞建筑材料中心试验室	是	255	-0.27	1.35	-0.85	-0.83	-0.22	-1.47	0.02	0.67	0.25	满意
79	镇江新区建设工程质量中心试验室	是	266	-0.27	-1.35	0.51	-0.42	-0.34	-0.49	-0.27	0.00	-1.72	满意
80	睢宁县建设工程质量检测中心	是	267	4.05★	无资质	无资质	2.49▲	0.90	0.12	-0.04	-1.35	-0.98	可疑
81	南京市建筑安装工程质量检测中心	是	268	-0.54	-1.35	0.05	0.83	-0.11	-0.49	0.09	0.67	0.00	满意
82	泰州市辉通交通工程检测有限公司	是	269	0.00	1.35	-0.93	0.83	-0.45	-0.86	2.41▲	0.67	1.59	满意
83	南通市交通工程试验检测中心有限公司	是	270	1.08	1.35	-0.01	0.42	-0.11	-0.61	2.59▲	-0.67	-0.37	满意

注：▲ 表示检测机构结果为可疑（除强度外）。

★ 表示检测机构结果为不满意（除强度外）。


△ 表示检测机构强度检测结果为可疑。

☆ 表示检测机构强度检测结果为不满意


B 样 主要稳健统计参数汇总表

项目	细度	密度	比表面积	标准稠度 用水量	初凝时间	终凝时间	胶砂流动度	3 天抗折强度	3 天抗压强度
结果数	83	80	80	80	83	83	83	83	83
中位值	0.42	3.04	374.45	28.2	175	230	204.7	5.4	26.6
四分一值	0.40	3.03	365.7	28.075	170	224	201.05	5.3	25.9
四分三值	0.45	3.05	379.45	28.4	182	235	208.5	5.5	27.0
四分位距	0.05	0.02	13.75	0.325	12	11	7.45	0.2	1.1
标准化四分位距	0.037	0.015	10.193	0.241	8.896	8.154	5.523	0.148	0.815
稳健 CV (%)	8.825	0.488	2.722	0.854	5.083	3.545	2.698	2.746	3.066
极 大 值	1.14	3.54	390.7	29.0	215	305	230.0	6.200	29.9
极 小 值	0.29	2.96	313.5	26.8	140	205	181.5	4.600	17.9
变动范围	0.85	0.58	77.2	2.2	75	100	48.5	1.600	12.0


z比分数直方图-项目：细度 样品：B样

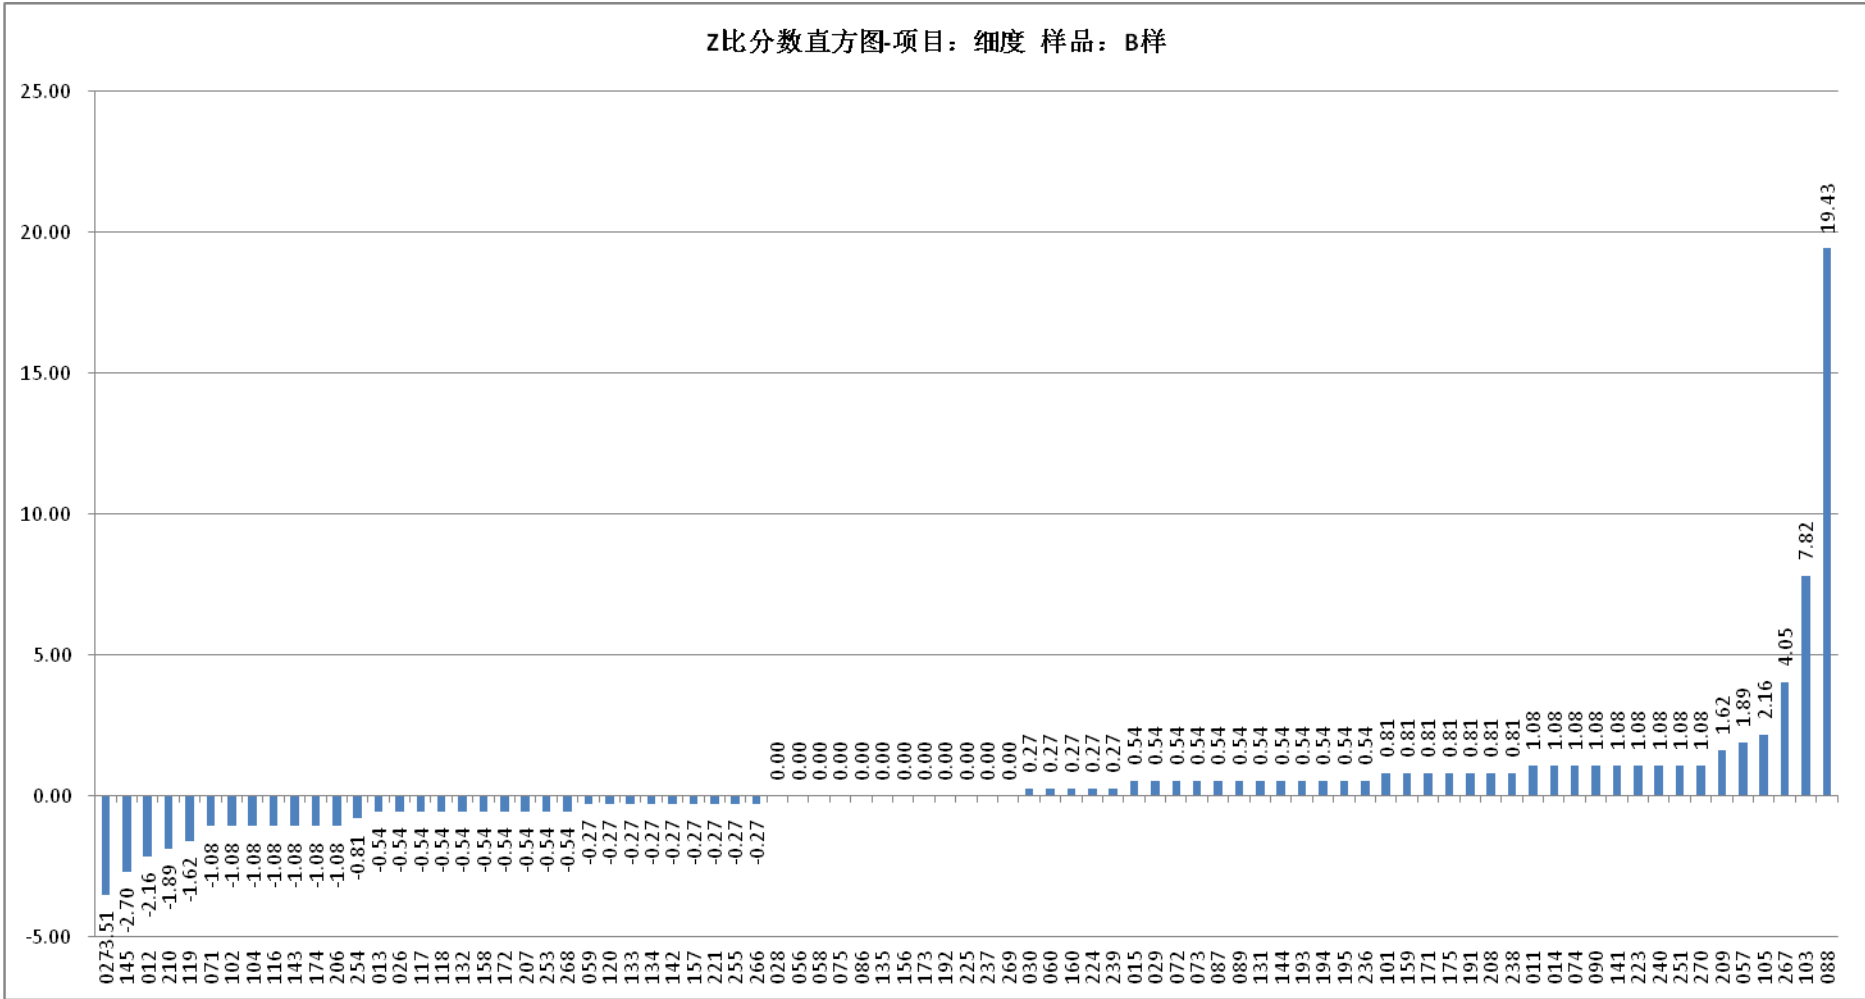


z比分数直方图-项目: 密度 样品: B样

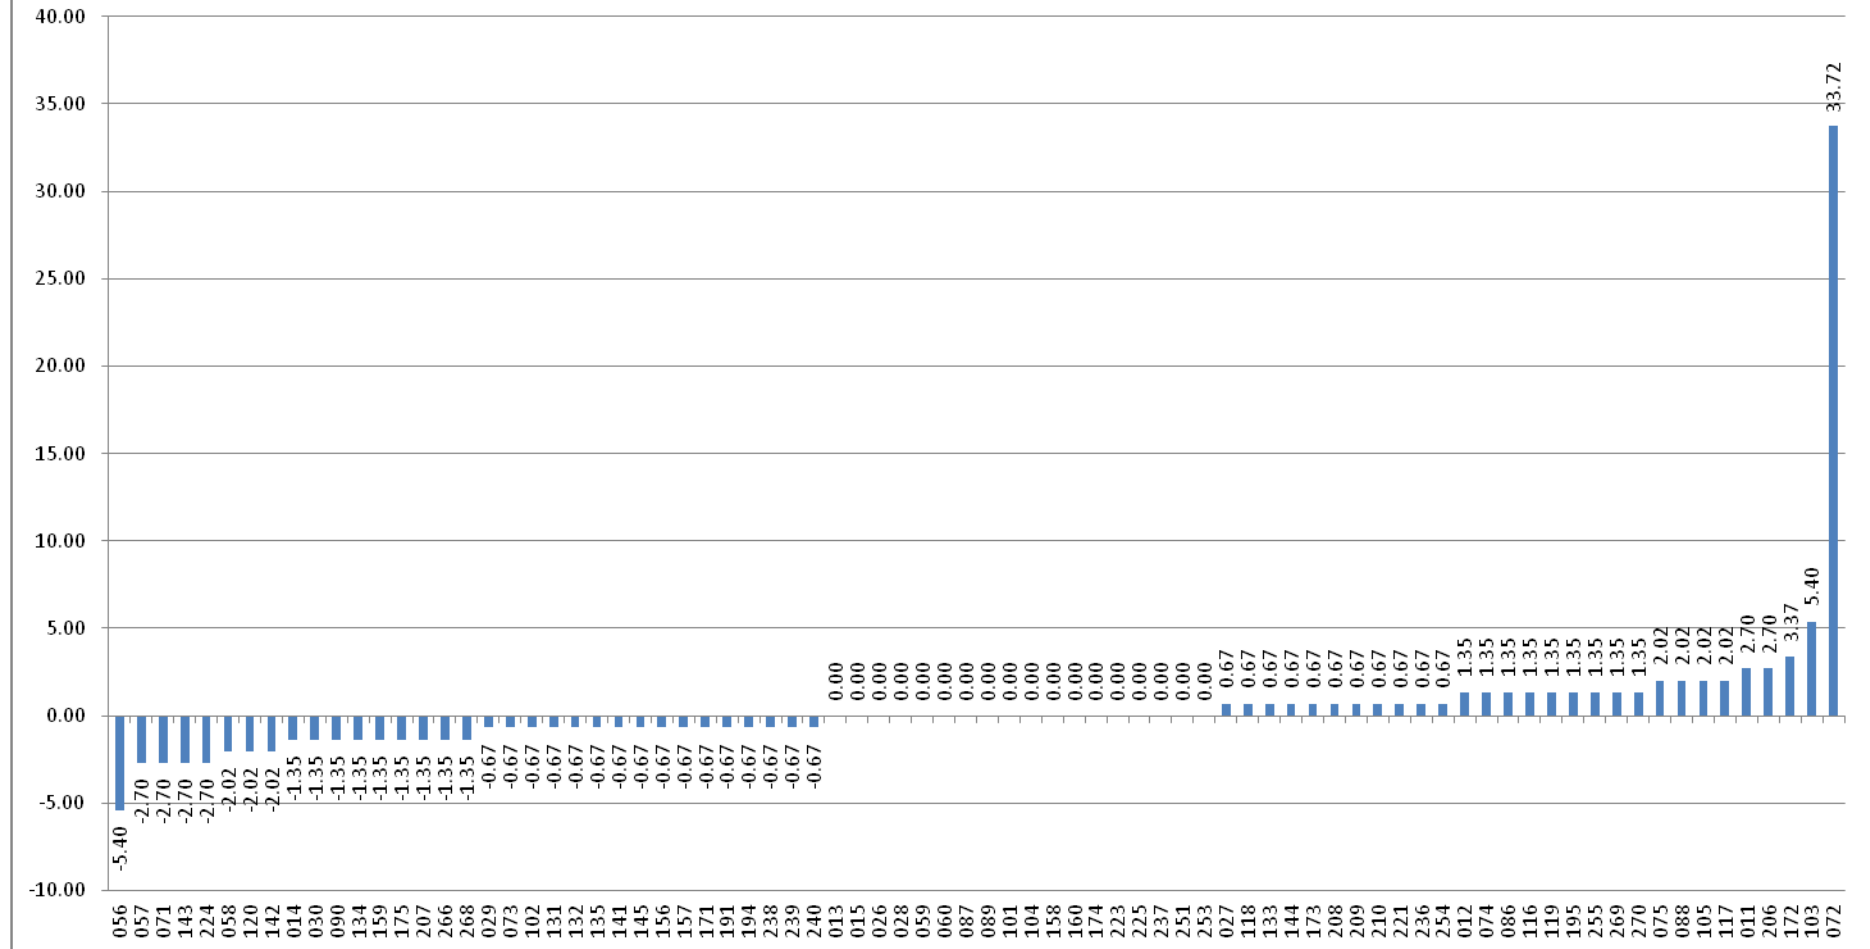


z比分数直方图-项目：比表面积 样品：B样

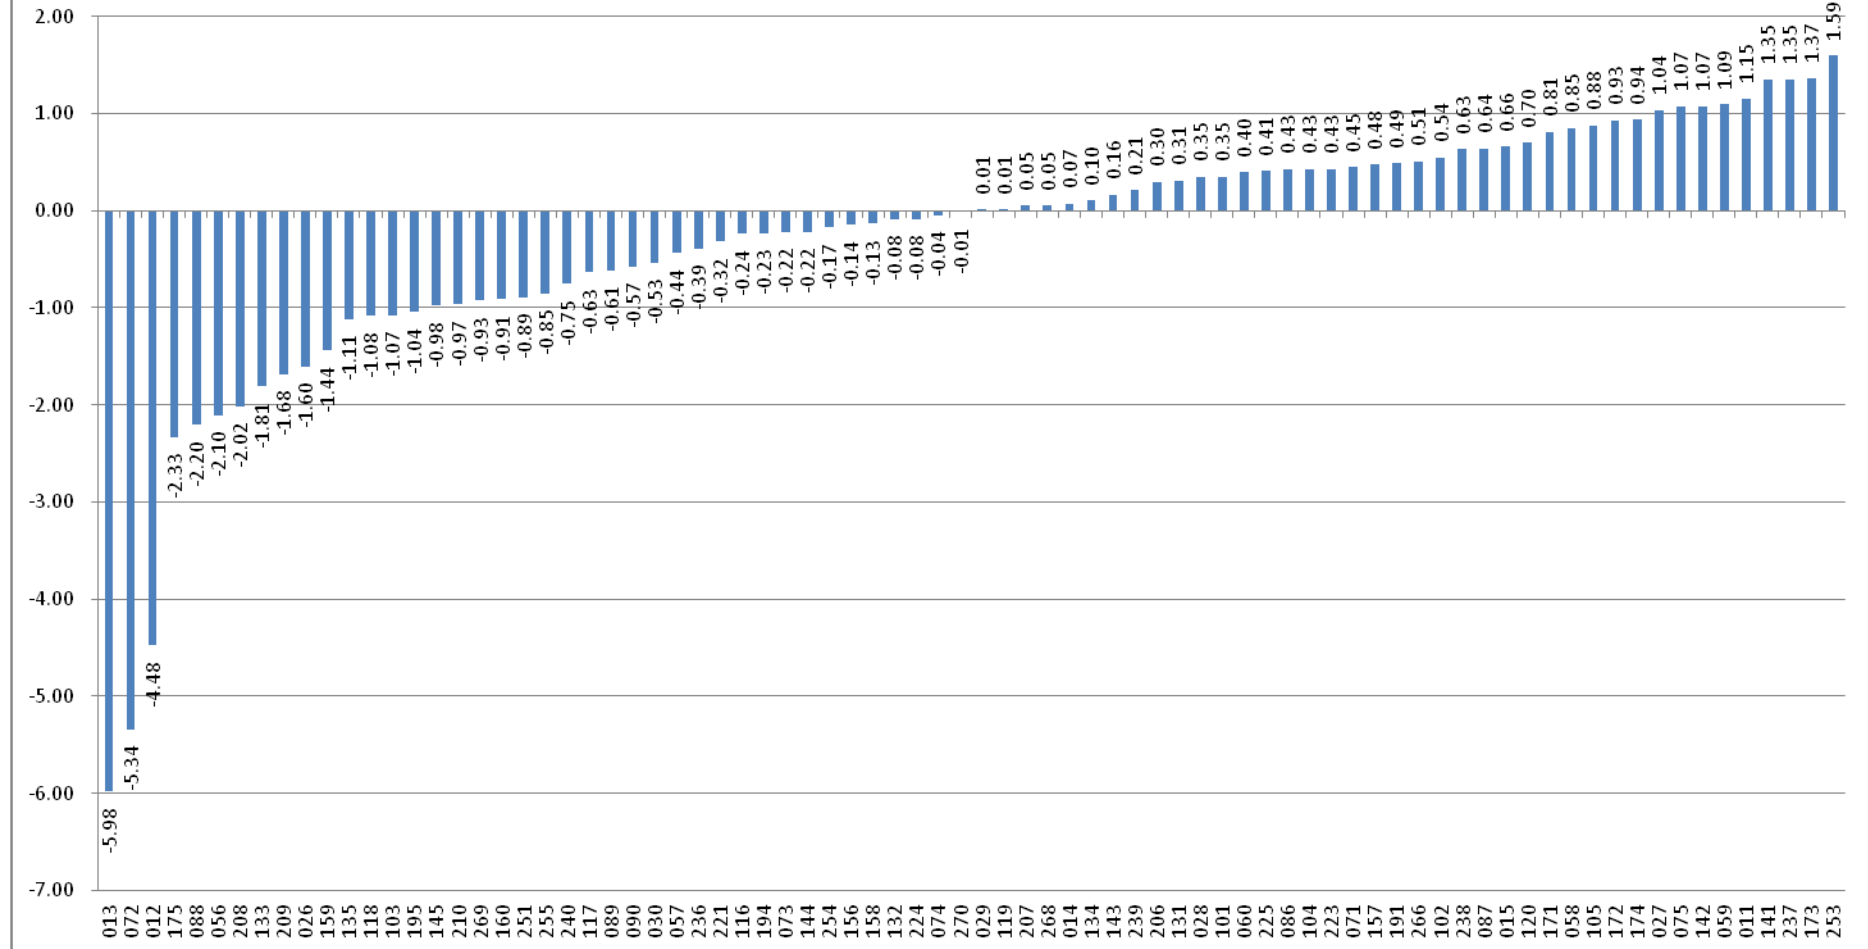


z比分数直方图 项目：标准稠度用水量 样品：B样

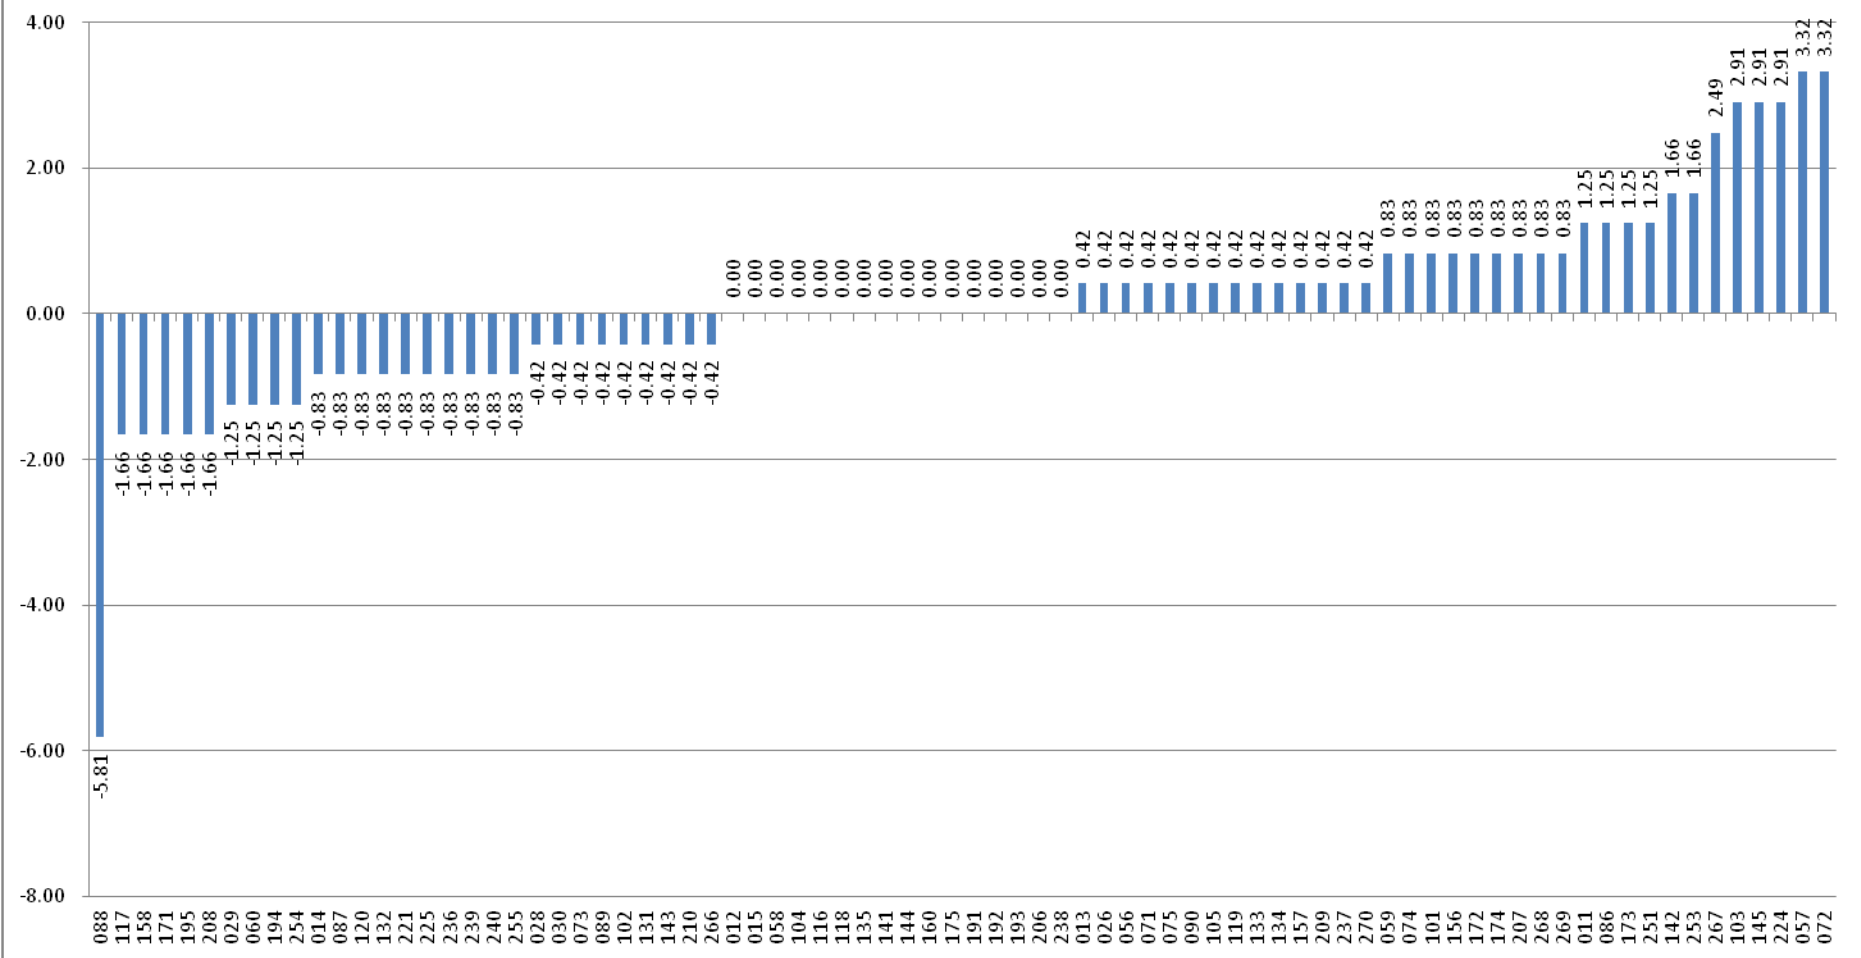


z比分数直方图-项目：初凝时间 样品：B样

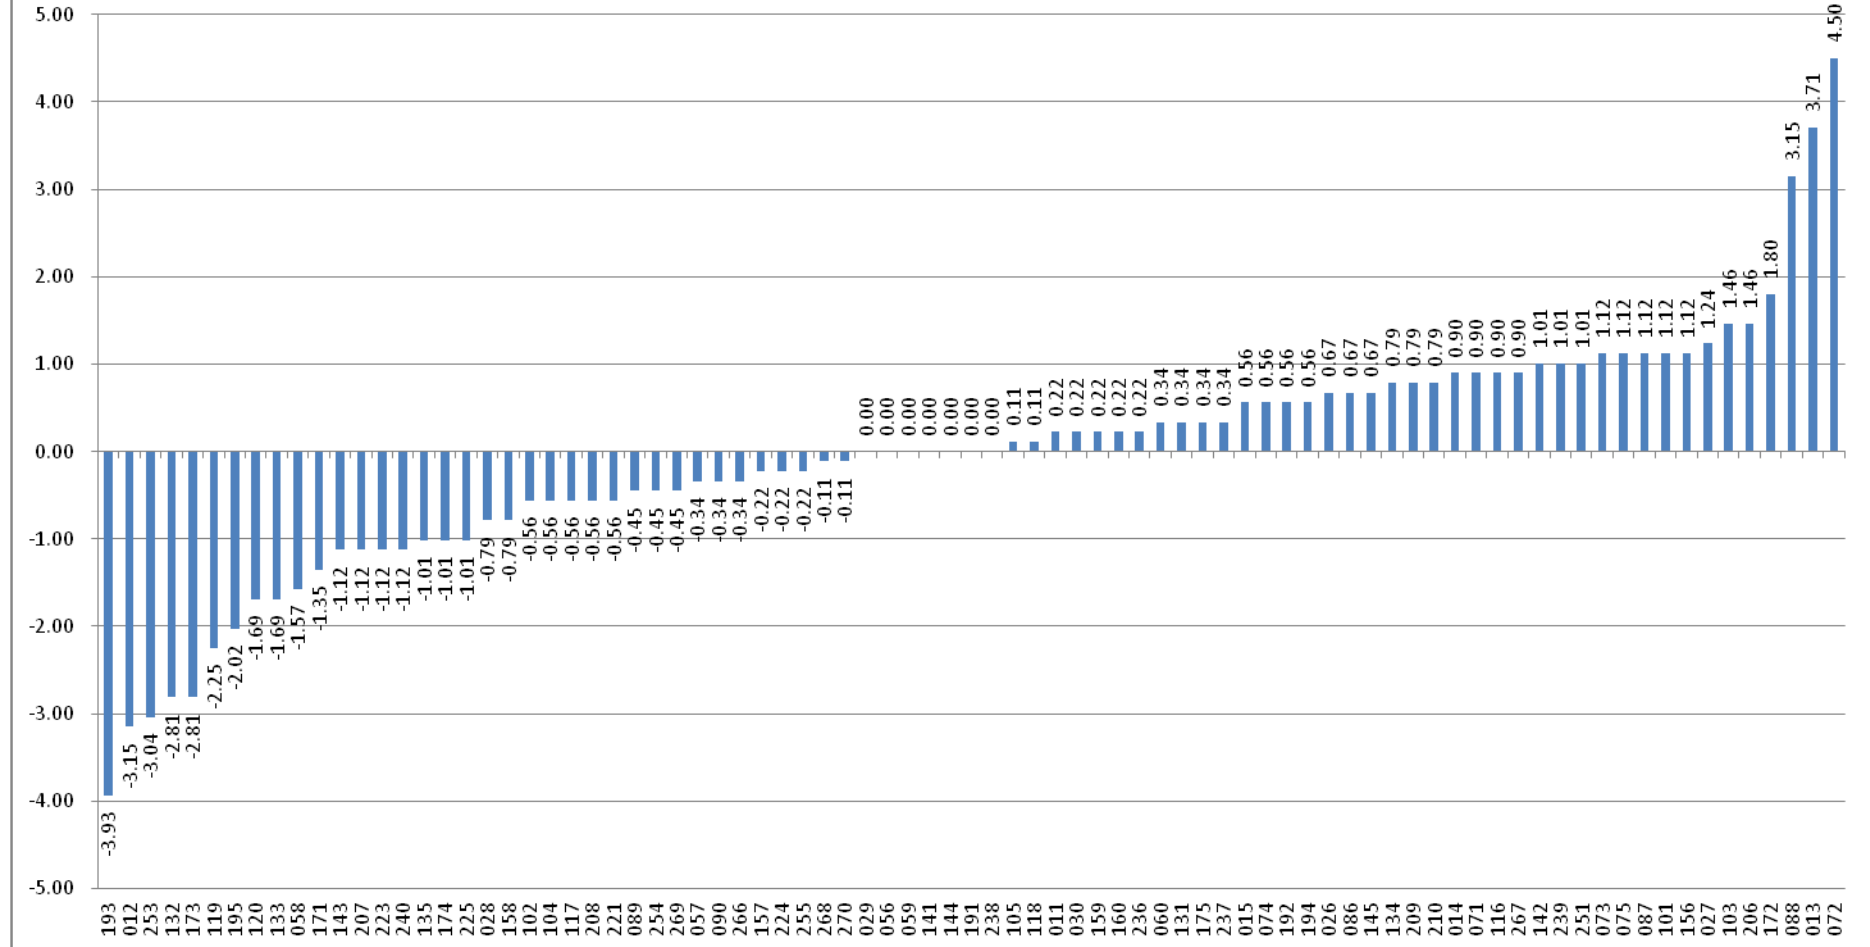


z比分数直方图-项目：终凝时间 样品：B样

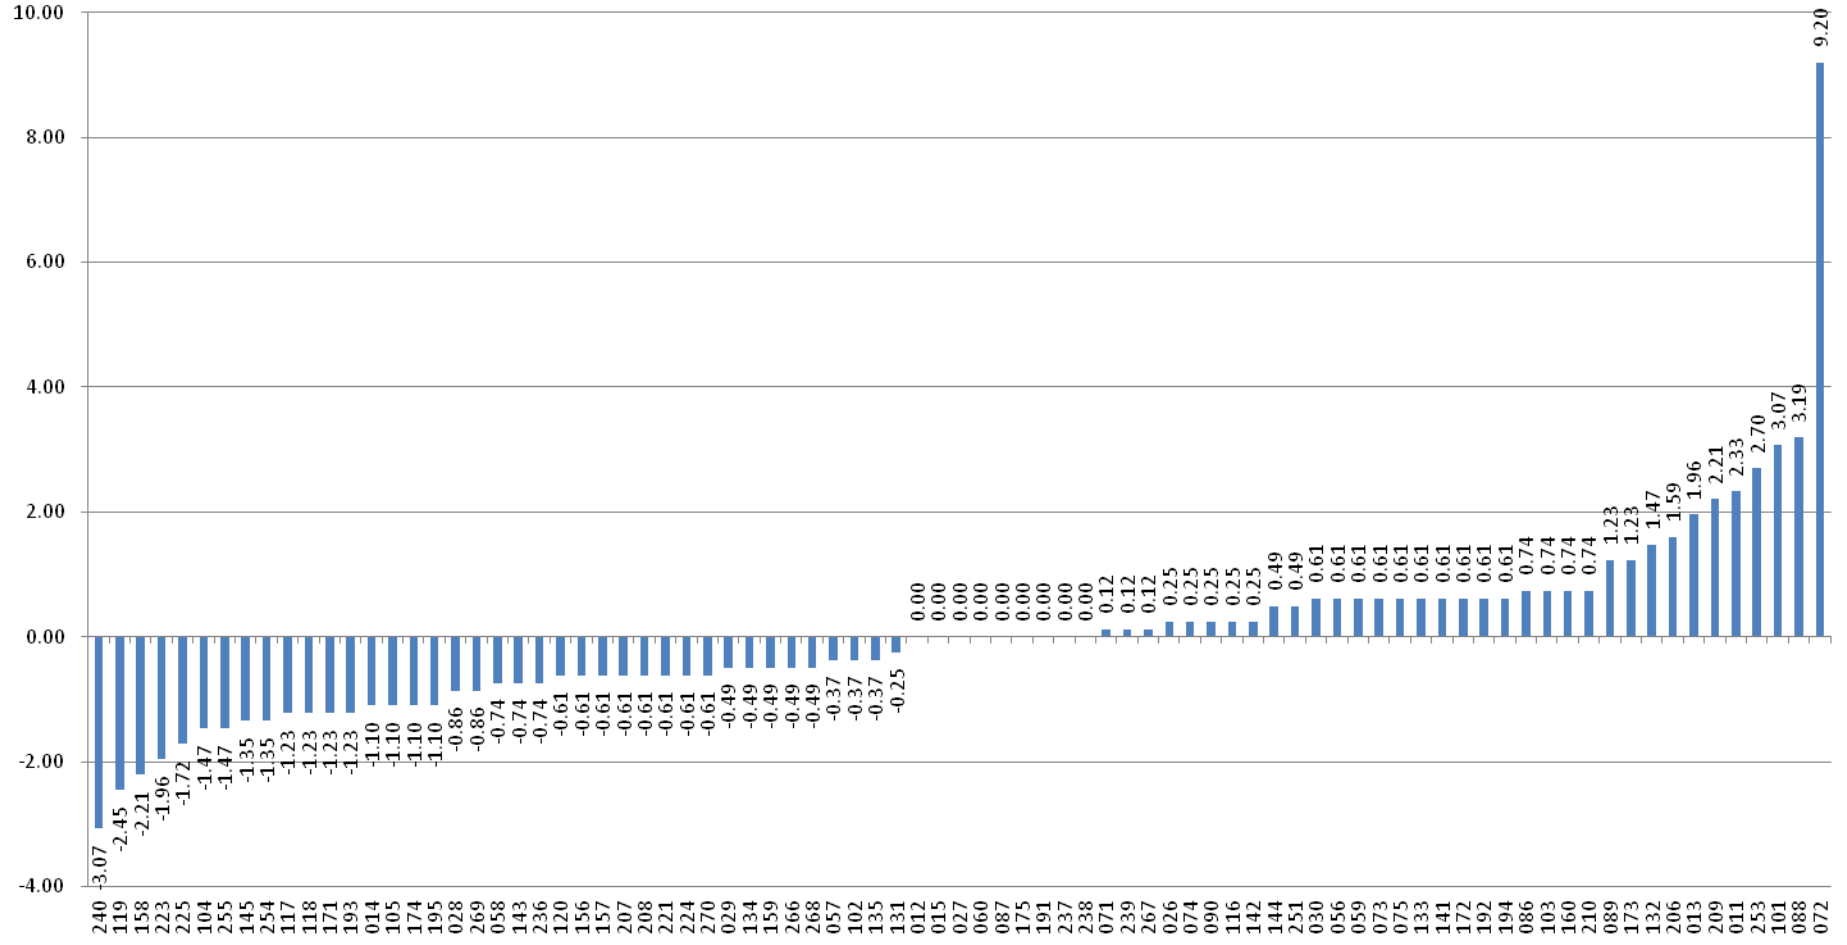


z比分数直方图-项目：胶砂流动度 样品：B样

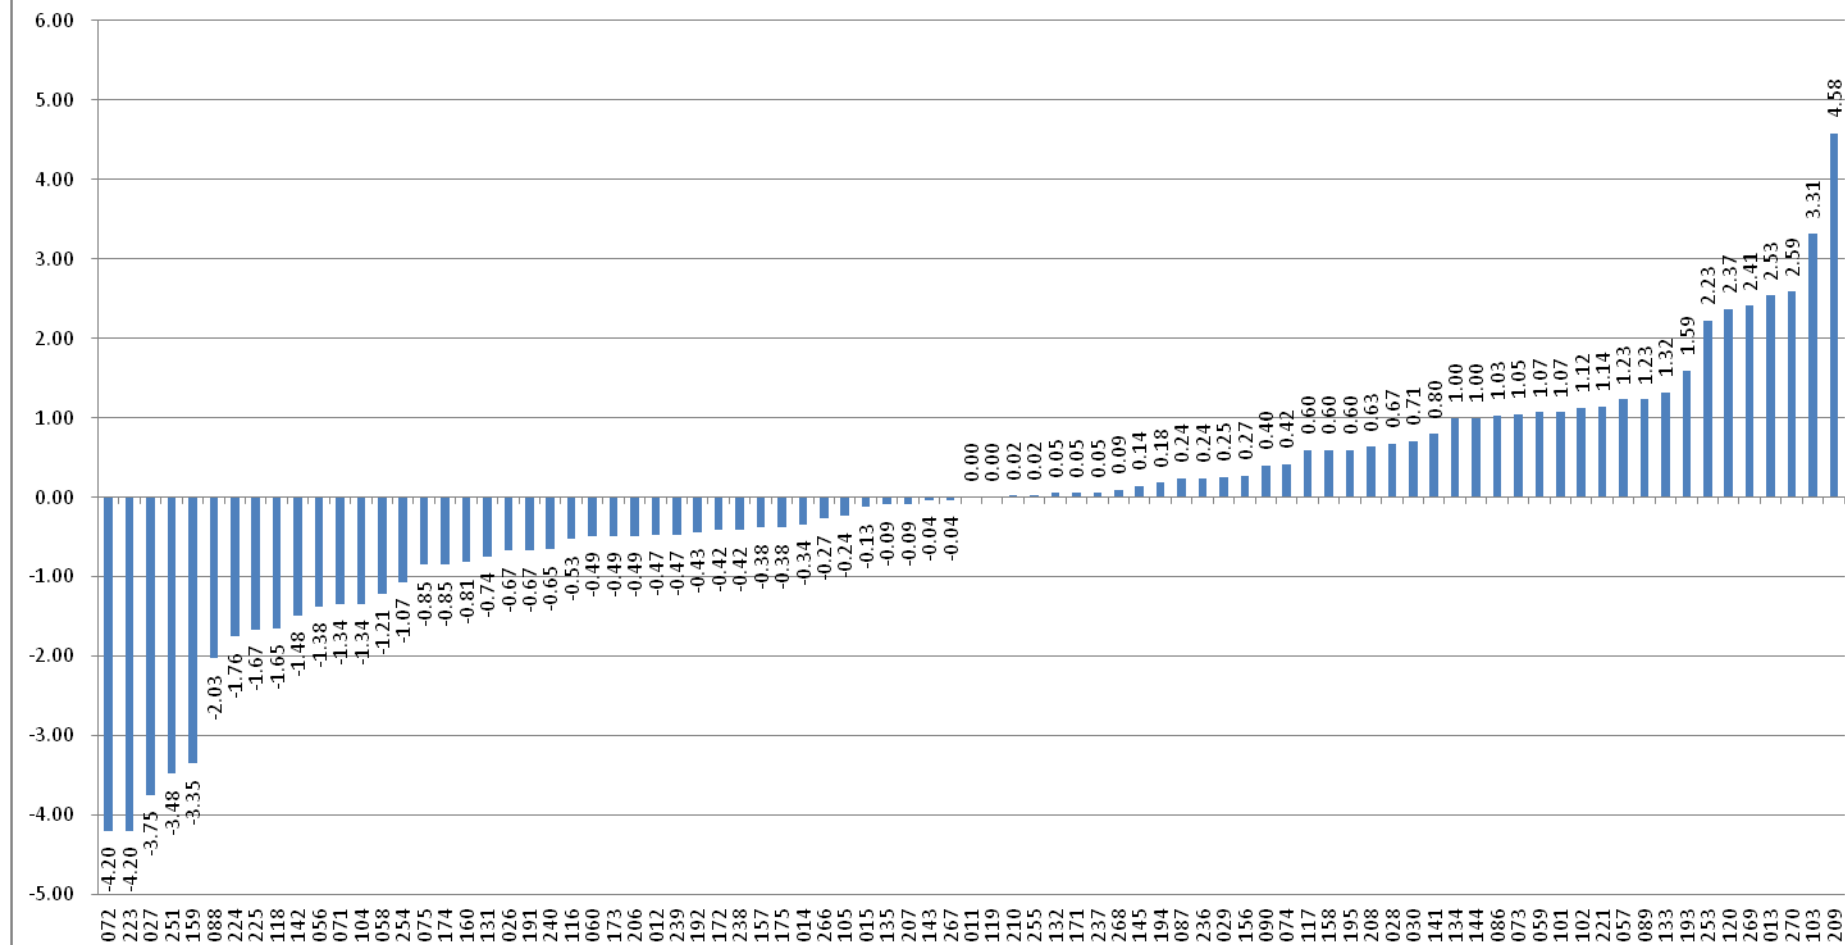

z比分数直方图-项目：3天抗折强度 样品：B样

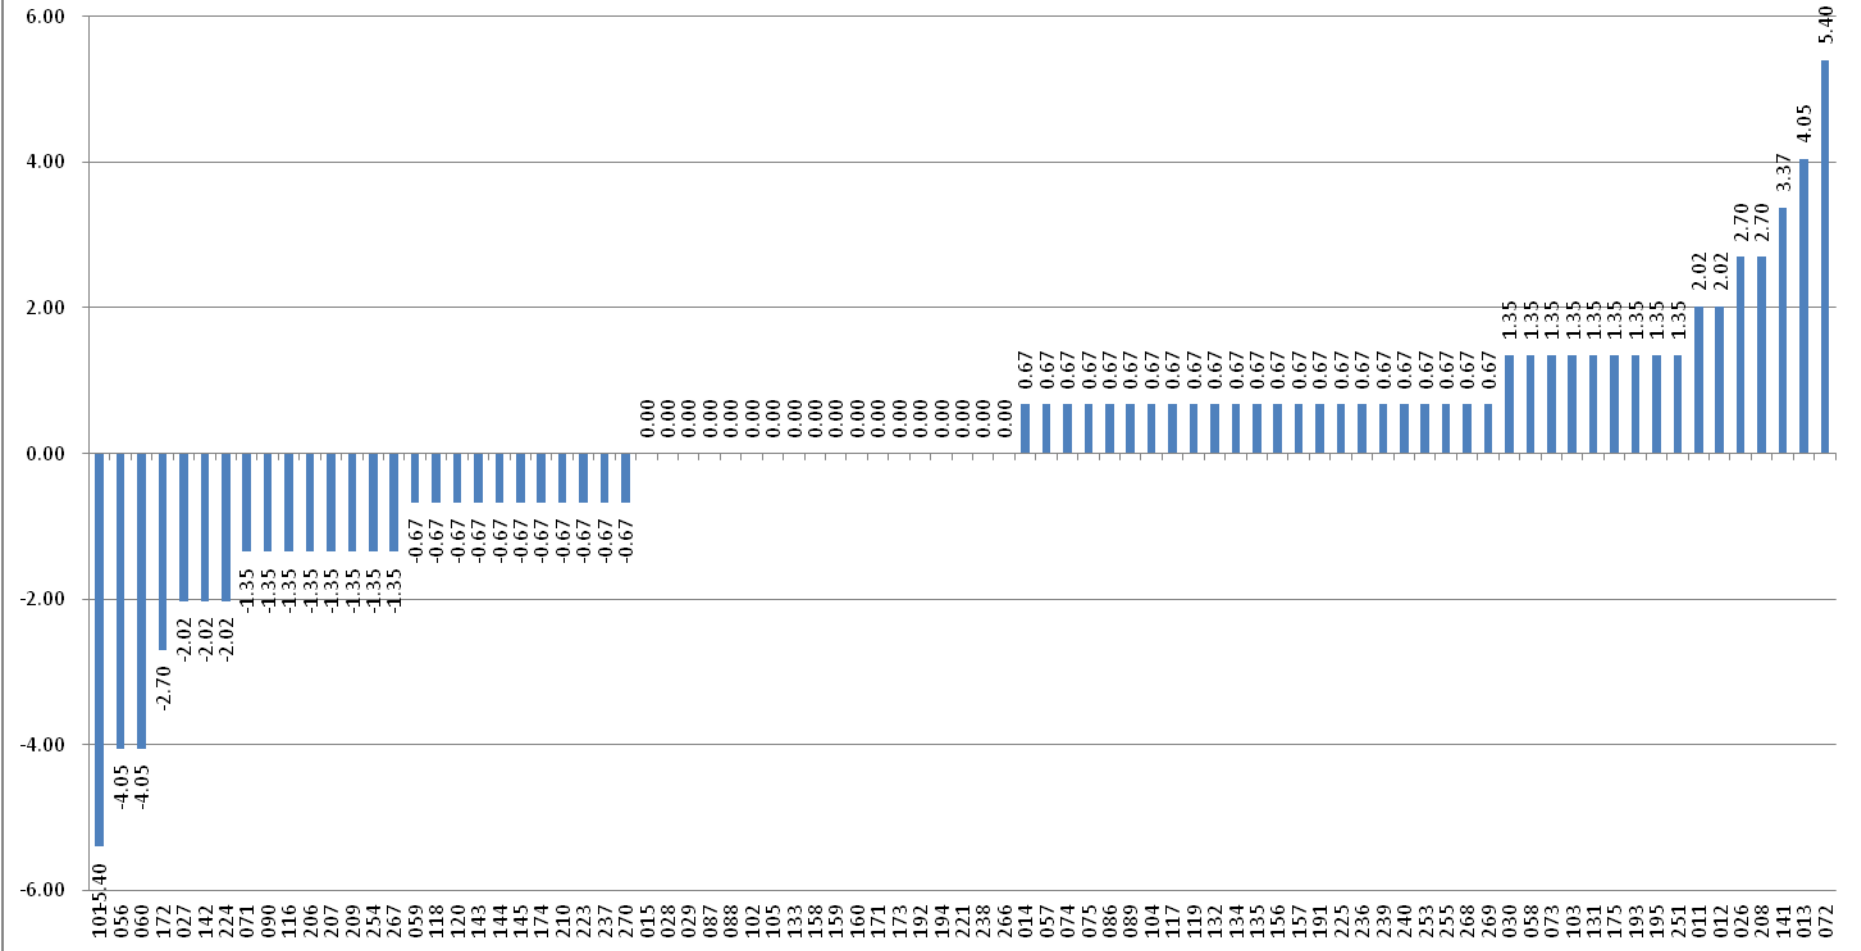

z比分数直方图-项目: 3天抗压强度 B样

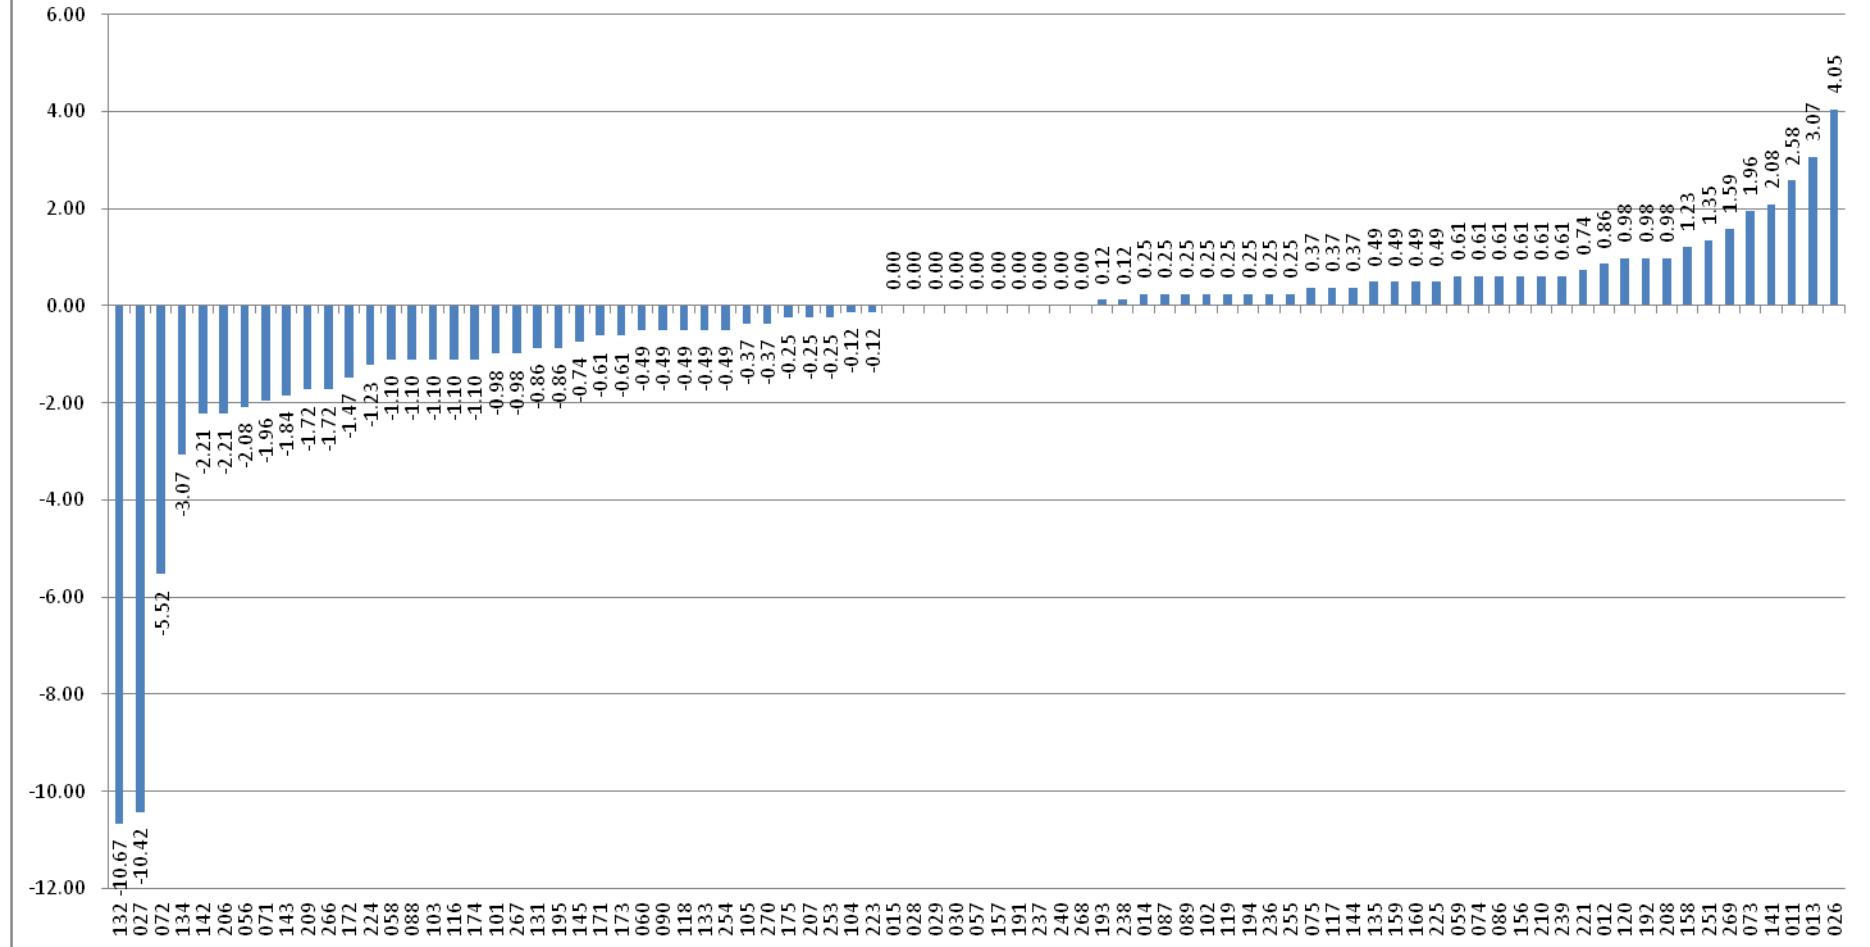

2014 年度江苏省水泥物理性能检测能力验证结果汇总表
(C 样)

序号	单位名称	是否具有 资质	样品 编号	Z 值									结 果
				细度	密度	比表面积	标准稠度 用水量	初凝时间	终凝时间	胶砂流动 度	3 天抗折 强度	3 天抗压 强度	
1	宿迁市新建工程质量检测有限公司	是	1	0.27	-1.35	-0.72	0.00	0.67	0.51	-0.67	0.54	1.31	满意
2	江苏东大工程检测技术有限公司	是	2	0.81	0.00	-0.05	0.00	0.67	-0.43	-0.93	-0.54	0.57	满意
3	太仓市建设工程质量检测中心有限公司	是	3	-1.08	-3.15★	-0.26	-1.35	-0.29	-0.51	2.61▲	0.00	0.74	可疑
4	金湖县建设工程质量检测有限公司	是	4	0.40	1.35	1.18	-0.45	0.00	-0.34	0.37	-0.54	-0.57	满意
5	宝应县建筑工程质量检测中心	是	5	-1.35	0.00	-0.05	-0.45	-0.48	-0.94	-0.35	-2.16△	-1.23	可疑
6	南京方园建设工程材料检测中心	是	16	-0.81	-0.90	-0.48	-1.80	-0.77	-0.43	1.28	-0.54	0.08	满意
7	无锡振华建设工程质量检测有限公司	是	17	0.00	0.45	-0.09	0.00	-0.77	-0.86	1.09	0.54	0.16	满意
8	沛县建设工程检测中心	是	18	0.13	0.00	-0.33	1.35	-0.77	-0.86	-0.35	1.08	-1.39	满意
9	常州市安贞建设工程质量检测有限公司	是	19	-0.81	-0.90	1.01	-0.45	-0.96	-1.03	-0.21	0.00	-2.29△	可疑
10	启东市长城建设工程质量检测有限公司	是	20	-1.89	-0.45	-0.05	5.40★	1.16	1.46	-2.99▲	-1.08	-1.96	可疑
11	东海县建设工程质量检测中心	是	31	-13.49★	0.90	6.04★	4.50★	2.99▲	2.83▲	-2.75▲	6.48☆	-0.90	不满意
12	盐城鼎晔建设工程质量检测有限公司	是	32	-1.89	-1.35	-1.68	0.90	0.00	0.00	-1.28	2.70△	-0.65	可疑
13	苏州方正工程技术开发检测有限公司	是	33	-0.67	0.00	0.25	-0.45	0.00	-0.51	-0.66	-0.54	0.00	满意
14	江苏科瑞特工程质量检测有限公司	是	34	0.54	-1.35	-0.22	0.00	-0.29	-0.94	0.03	0.00	0.16	满意
15	金坛市建设工程质量检测中心	是	35	-1.08	-0.45	0.89	0.90	-0.58	-0.94	-0.26	0.00	-0.08	满意

16	南京市六合区建设工程质量检测中心	是	46	-0.54	-0.90	-0.23	0.90	0.48	1.11	0.08	-0.54	0.33	满意
17	江苏正大工程检测有限公司	是	47	-2.29▲	-0.45	0.20	0.45	0.19	0.00	2.03▲	0.00	-1.06	满意
18	中信节能与环境检测研究发展中心有限公司	是	48	-0.13	0.90	-0.98	-0.90	0.00	-0.69	-0.03	1.08	0.16	满意
19	大丰市国建建设工程质量检测有限公司	是	49	0.27	-0.90	0.05	0.00	0.96	-0.86	2.37▲	-2.70△	0.49	可疑
20	扬州市建筑工程质量检测中心有限公司	是	50	-0.27	-0.90	-0.12	0.00	-0.10	0.09	0.32	0.00	0.16	满意
21	靖江市建设工程检测中心有限公司	是	61	0.54	-0.45	-1.00	0.45	-2.99▲	-1.28	0.06	-1.08	0.41	满意
22	南通市建筑科学研究院有限公司	是	62	1.21	-0.45	0.87	-1.80	0.19	0.86	-0.16	1.08	-0.41	满意
23	无锡江大建设工程质量检测有限公司	是	63	-1.21	0.00	0.11	0.90	-0.58	-0.43	0.21	-3.78☆	-0.25	不满意
24	江苏祥瑞工程检测有限公司	是	64	-1.08	-0.90	-0.05	-0.45	-0.67	0.00	0.37	1.08	0.25	满意
25	铜山区建设工程检测中心	是	65	0.67	无资质	无资质	0.45	0.67	1.20	1.81	0.54	-1.31	满意
26	无锡市建筑工程质量检测中心	是	76	1.21	0.00	-0.26	-0.90	-0.96	0.26	1.54	0.00	1.14	满意
27	常州市慧宇建筑工程质量检测有限公司	是	77	-0.54	-0.45	1.31	0.00	-0.29	-1.03	-0.56	0.54	-0.98	满意
28	苏州中正工程检测有限公司	是	78	0.54	-1.35	-0.48	0.00	-0.19	-0.34	0.27	-1.08	0.25	满意
29	连云港科建工程质量检测有限公司	是	79	0.40	0.45	0.18	-0.45	-0.10	0.17	1.04	1.62	0.16	满意
30	江苏省秦鼎建设工程质量检测有限公司	是	80	-1.35	-0.45	1.26	0.90	1.64	1.71	-2.35▲	0.54	0.41	满意
31	沭阳县建设工程质量检测中心	是	91	0.81	1.80	1.20	4.05★	0.19	1.28	0.13	0.00	-3.52☆	不满意
32	镇江四方建设工程质量检测有限公司	是	92	0.00	0.90	-1.39	-0.45	0.87	1.63	0.69	-2.16△	0.16	可疑
33	盐城明阳建设工程检测有限责任公司	是	93	-0.27	-0.90	1.80	1.35	0.67	1.28	-1.51	0.54	-1.88	满意
34	南通瑞利山河建设工程质量检测有限公司	是	94	0.67	0.00	0.87	0.00	-0.48	-0.17	-1.23	-0.54	-0.57	满意
35	南京天隆工程检测有限公司	是	95	2.56▲	0.90	超一个数量级， 判为不满意★	未换算，判为不 满意★	-0.77	3.00★	2.13▲	1.08	0.41	可疑

36	南京科杰建设工程质量检测有限公司	是	106	0.00	0.45	0.26	-0.90	-0.10	0.00	0.78	0.54	0.82	满意
37	徐州市建设工程检测中心	是	107	0.13	0.00	0.22	-0.90	-0.58	0.00	1.39	-0.54	0.49	满意
38	淮安建伟工程检测有限公司	是	108	-2.02▲	0.90	0.75	1.80	-0.29	0.86	-0.19	-1.62	-4.50☆	不满意
39	江苏引江建筑材料检测实验室	是	109	0.40	2.25▲	13.00★	0.00	0.96	3.17★	-0.35	4.32☆	4.01☆	不满意
40	苏州交通工程试验检测中心有限公司	是	110	-1.35	0.45	0.29	-1.80	-0.48	-0.34	0.74	-0.54	-3.11☆	不满意
41	镇江市建科工程质量检测中心有限公司	是	121	0.00	-0.90	-0.80	0.00	-0.77	0.00	0.37	1.62	-0.65	满意
42	淮安市振淮工程检测有限公司	是	122	0.67	0.90	1.29	-0.45	0.19	0.00	-1.62	0.54	0.08	满意
43	昆山市建设工程质量检测中心	是	123	0.67	0.00	-0.74	-0.45	0.87	0.17	-0.59	0.00	0.41	满意
44	丰县建设工程检测中心	是	124	1.48	-0.45	0.78	-0.90	-0.67	-1.28	1.97	6.48☆	-1.55	不满意
45	南京鑫盛盛建筑工程质量检测有限公司	是	125	0.00	0.90	-0.39	0.00	1.06	0.00	-0.56	1.08	0.41	满意
46	无锡市前友工程咨询检测有限公司	是	136	1.08	无资质	无资质	0.00	0.87	0.60	-0.59	0.54	0.08	满意
47	常熟市工程质量检测中心	是	137	-0.27	-4.05★	-1.19	4.50★	3.57★	2.57▲	-2.03▲	-0.54	0.41	可疑
48	吴中区建设工程质量检测中心	是	138	0.94	-1.35	-1.00	未换算，判为不满意★	0.39	0.09	0.24	-1.08	0.08	可疑
49	灌云建科建设工程质量检测中心	是	139	1.35	0.00	0.35	1.80	1.73	2.31▲	-0.91	5.94☆	1.64	不满意
50	盐城市志远建设工程质量检测有限公司	是	140	0.81	-0.45	0.65	0.00	0.00	0.69	-0.59	0.54	-0.57	满意
51	兴化市建设工程质量检测有限公司	是	151	0.00	-1.35	-3.06★	0.45	-0.77	-0.43	-0.88	-0.54	0.16	可疑
52	泗阳县建设工程质量检测中心	是	152	-4.99★	0.90	-2.04▲	-0.45	1.83	2.83▲	-1.99	3.24☆	-1.31	不满意
53	南通耀华建设工程质量检测有限公司	是	153	0.67	无资质	无资质	0.45	1.45	1.20	-1.23	0.54	-1.06	满意
54	常熟通正工程检测有限公司	是	154	-0.94	2.25▲	1.74	2.25▲	1.06	0.34	1.51	0.00	0.65	满意

55	连云港市建院工程勘察检测有限公司	是	155	0.13	-1.80	-0.92	-0.90	-0.77	-1.11	0.66	1.08	-1.06	满意
56	镇江市丹徒区建筑工程质量检测中心	是	166	-0.13	-0.45	-0.48	-0.90	0.87	1.28	-0.51	1.08	0.57	满意
57	江苏方圆建设工程检测有限公司	是	167	-0.40	0.90	-1.28	2.25▲	0.96	-0.77	1.81	-0.54	-1.72	满意
58	南通昊晟建设工程质量检测有限公司	是	168	无资质	无资质	无资质	0.90	-0.29	-1.28	-0.11	0.54	-0.08	满意
59	张家港市恒信建设工程检测有限公司	是	169	-1.35	-2.25▲	1.34	0.45	0.19	0.00	0.93	0.00	-0.16	满意
60	苏州求正工程质量检测有限公司	是	170	-0.67	-0.45	-0.35	0.00	-0.96	0.09	1.52	-0.54	0.49	满意
61	江苏建盛工程质量检测有限公司	是	181	无资质	无资质	无资质	1.35	-0.67	-0.69	-2.32▲	0.00	-1.55	满意
62	南京金鑫检测工程有限责任公司	是	182	-0.40	1.80	2.28▲	0.90	0.00	0.00	0.03	0.00	-1.31	满意
63	徐州淮海建设工程试验研究所有限公司	是	183	-1.21	-0.90	0.23	0.00	0.00	0.26	0.42	1.08	-0.49	满意
64	南通同诚建设工程质量检测有限公司	是	184	0.40	-1.35	-0.43	2.25▲	0.19	0.00	0.37	0.54	0.49	满意
65	盐城市建业工程质量检测有限公司	是	185	1.62	-1.80	1.24	0.45	0.67	0.51	-1.84	0.00	0.90	满意
66	扬州华正建筑工程质量检测有限公司	是	196	-0.27	-0.90	-0.24	0.00	-0.19	0.00	0.13	1.62	-0.90	满意
67	泰州市城建建设工程质量检测有限公司	是	197	0.27	0.00	-0.43	-0.90	-0.39	-0.69	0.69	0.00	0.08	满意
68	南通博融工程质量检测有限公司	是	198	-1.75	-0.45	-1.04	0.45	0.48	-0.51	-0.21	0.54	-0.25	满意
69	苏州市建设工程质量检测中心有限公司	是	199	0.67	-1.35	-0.55	0.00	0.19	0.26	0.19	-0.54	-0.08	满意
70	常州市晋陵建设工程检测有限公司	是	200	-0.54	0.00	0.98	-0.45	0.67	-1.03	0.21	0.00	-0.41	满意
71	海安县苏中工程质量检测中心有限公司	是	226	0.54	0.00	1.03	0.00	-1.25	-2.14▲	-2.19▲	-0.54	-0.98	满意
72	江苏恒正建设工程检测有限公司	是	227	0.81	1.35	1.05	0.00	-0.96	-0.17	-1.79	0.00	-1.06	满意
73	扬州苏油工程质量检测有限公司	是	228	-0.27	0.00	0.07	-1.80	-0.77	-0.86	0.13	1.08	0.00	满意
74	泰州市泰建建设工程检测有限公司	是	229	无资质	无资质	无资质	5.85★	0.19	-0.86	-1.22	2.16△	-0.08	可疑

75	江苏省建工建材质量检测中心	是	230	-0.54	0.00	-0.08	0.90	-0.87	-0.26	0.69	0.00	0.41	满意
76	南京德润建筑工程检测有限公司	是	241	-0.27	0.00	0.76	-1.35	0.19	-0.60	0.70	0.00	-0.82	满意
77	宜兴市鑫祥建设材料研究有限公司	是	242	0.40	1.35	1.65	-0.45	0.39	-0.34	-0.56	1.08	-0.16	满意
78	如东县建设工程质量检测中心	是	243	-0.13	-0.90	0.98	0.90	-0.29	-0.43	-2.67▲	0.00	-0.25	满意
79	盱眙县建设工程质量检测中心	是	244	-1.75	-0.90	-0.43	0.00	2.12▲	1.28	-3.31★	-1.62	-1.39	可疑
80	东台市金铭建设工程质量检测有限公司	是	245	-2.29▲	-1.35	0.73	0.00	0.10	1.03	-0.66	0.54	0.25	满意
81	南京裕扬工程检测有限责任公司	是	261	-0.54	无资质	无资质	0.90	-1.73	2.14▲	-0.59	有资质 未填报, 判为不 满意☆	有资质 未填报, 判为不 满意☆	不满意
82	江阴市经纬工程质量检测有限公司	是	262	0.67	0.45	-4.88★	-4.05★	-8.38★	-7.02★	2.99▲	0.00	1.23	可疑
83	泰州市同一建设工程质量检测有限公司	是	263	0.67	0.00	-1.70	-0.45	-0.67	-0.34	0.22	-1.08	0.16	满意
84	扬州市信达工程质量检测有限公司	是	264	-0.94	0.90	0.43	-0.90	-1.73	0.86	-0.59	-1.62	2.86△	可疑

注：▲ 表示检测机构结果为可疑（除强度外）。

★ 表示检测机构结果为不满意（除强度外）。


△ 表示检测机构强度检测结果为可疑。

☆ 表示检测机构强度检测结果为不满意


C 样 主要稳健统计参数汇总表

项目	细度	密度	比表面积	标准稠度 用水量	初凝时间	终凝时间	胶砂流动度	3 天抗折强度	3 天抗压强度
结果数	81	77	76	82	84	84	84	83	83
中位值	1.20	3.12	349.0	25.6	183	235	213.7	5.8	29.1
四分一值	1.14	3.10	344.6	25.5	176	227.75	209.575	5.7	27.95
四分三值	1.24	3.13	357.05	25.8	190	243.5	218.0	5.95	29.6
四分位距	0.10	0.03	12.45	0.30	14.00	15.75	8.425	0.25	1.65
标准化四分位距	0.074	0.022	9.229	0.222	10.378	11.675	6.245	0.185	1.223
稳健 CV (%)	6.178	0.713	2.644	0.869	5.671	4.968	2.923	3.195	4.203
极大值	1.39	3.17	469.0	26.9	220	272	232.4	7.0	34.0
极小值	0.20	3.03	304.0	24.7	96	153	193.0	5.1	23.6
变动范围	1.19	0.14	165.0	2.2	124	119	39.4	1.9	10.4


z比分数直方图项目: 细度 样品: c样

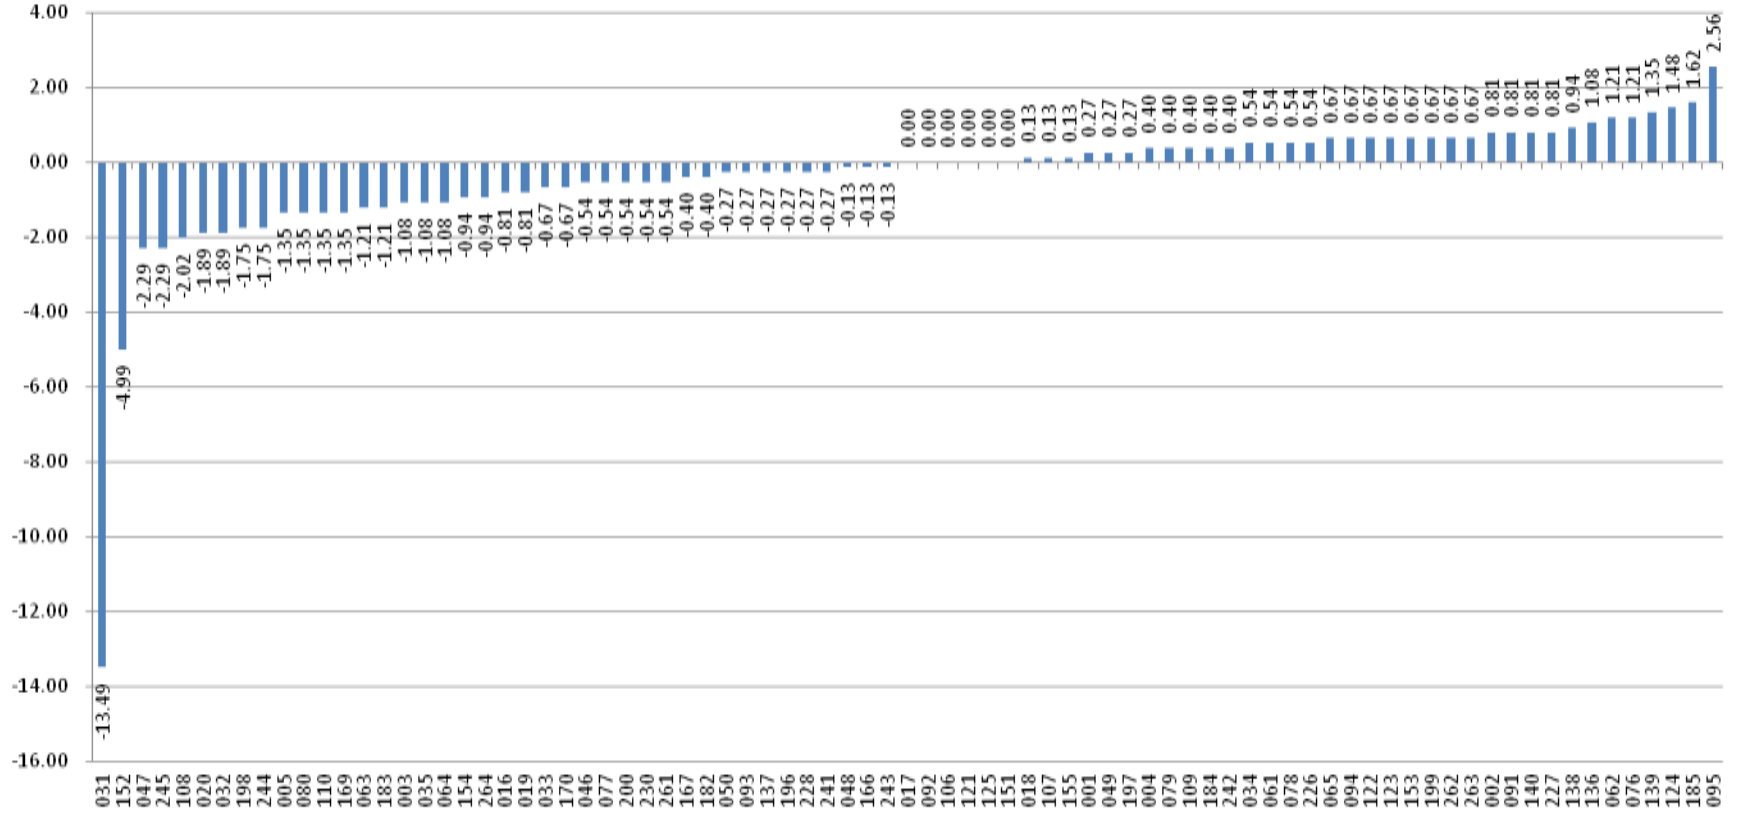


z比分数直方图-项目: 密度 样品: C样

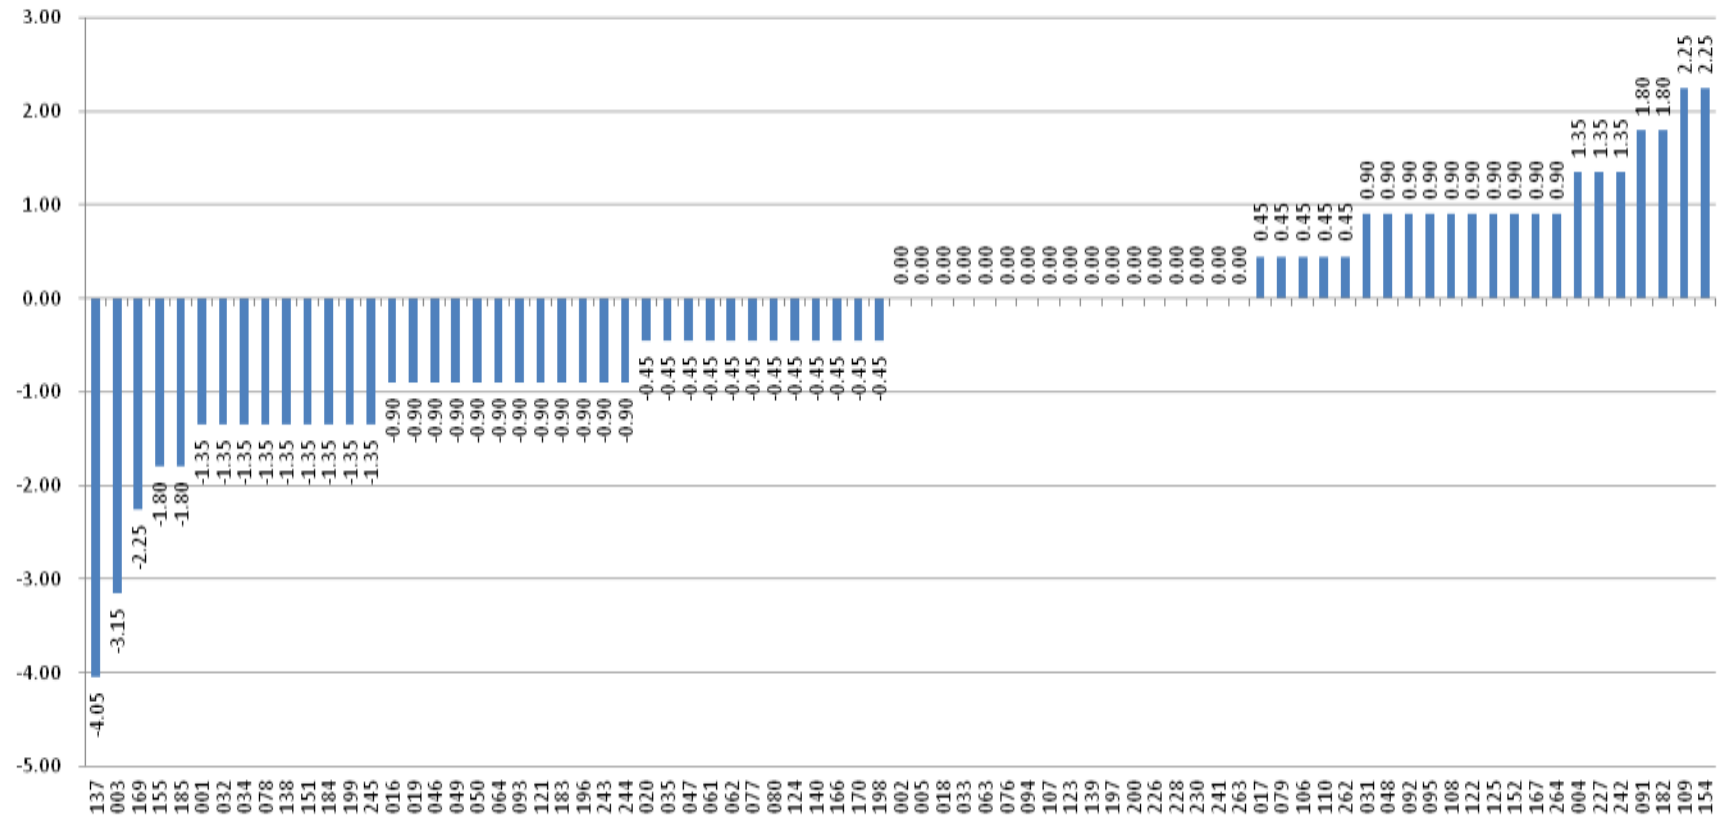


z比分数直方图-项目：比表面积 样品：c样

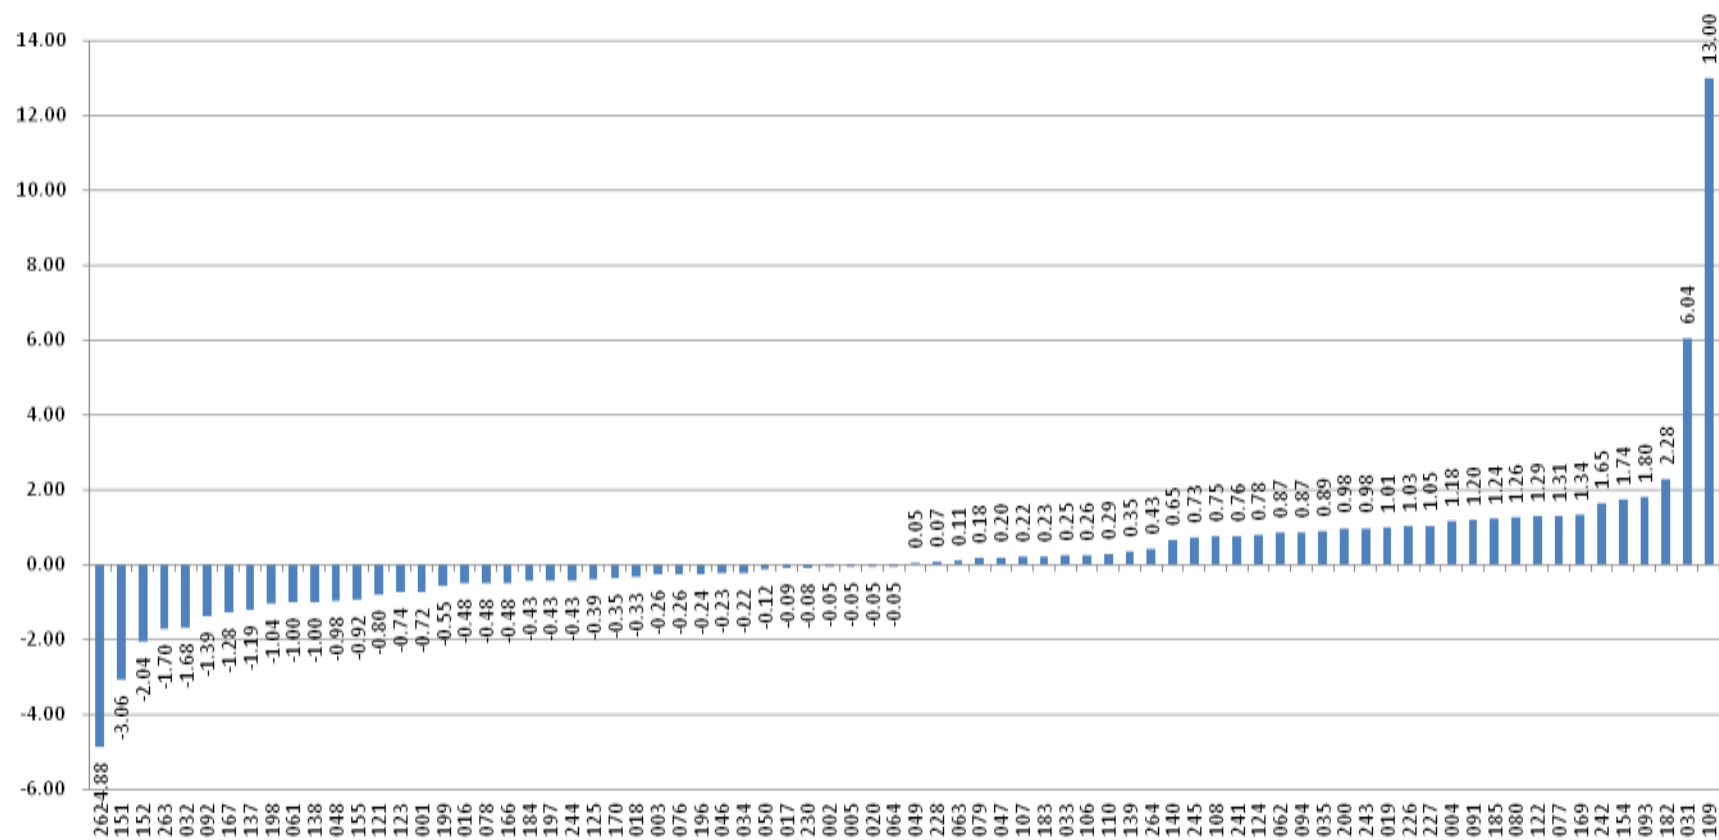


z比分数直方图-项目: 标准稠度用水量 样品: C样

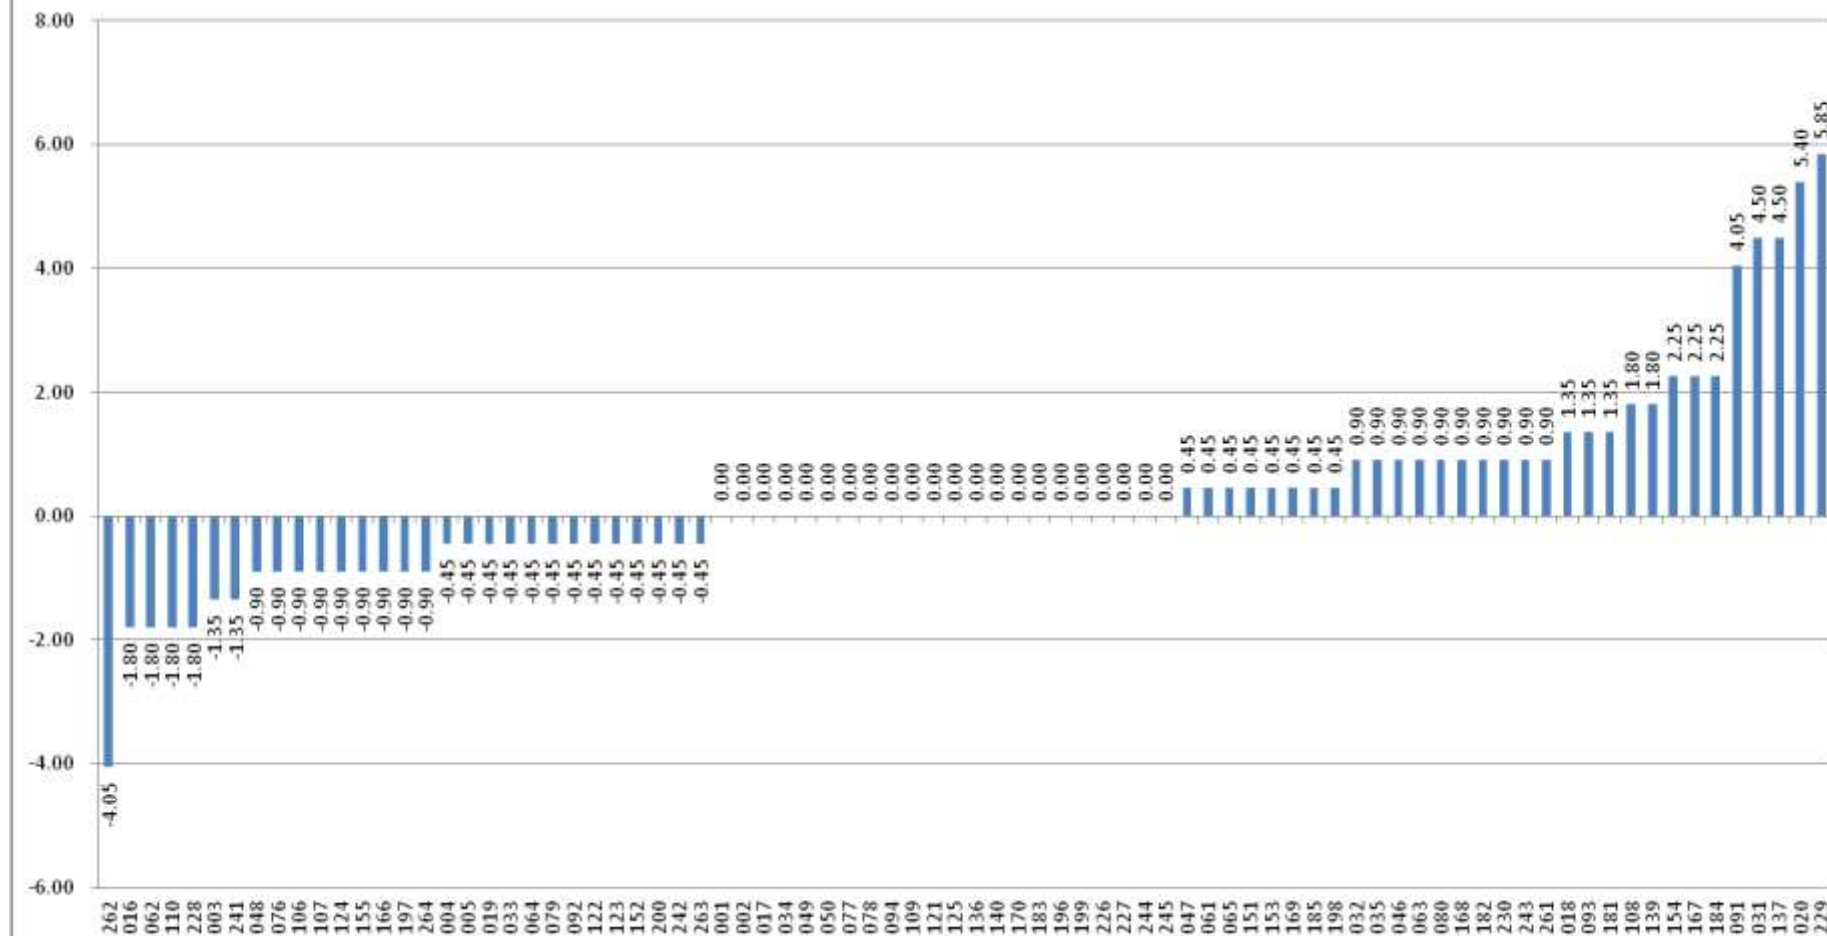


z比分数直方图-项目：初凝时间 样品：C样

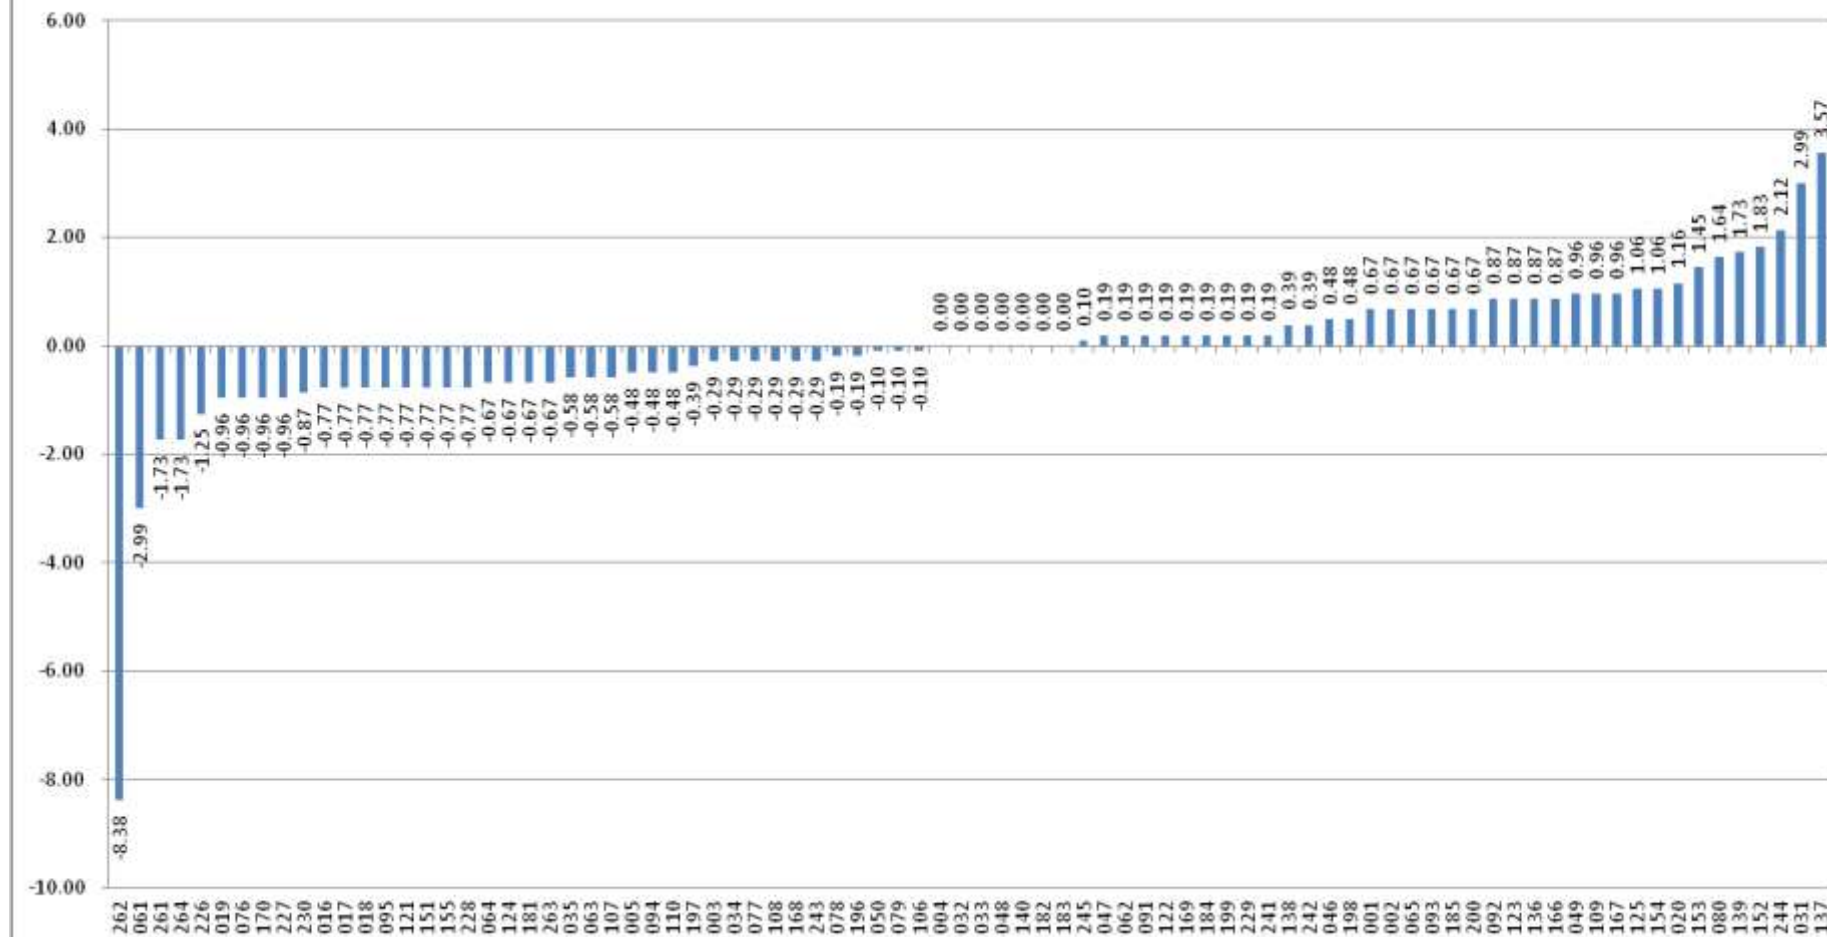

z比分数直方图-项目: 终凝时间 样品: C样

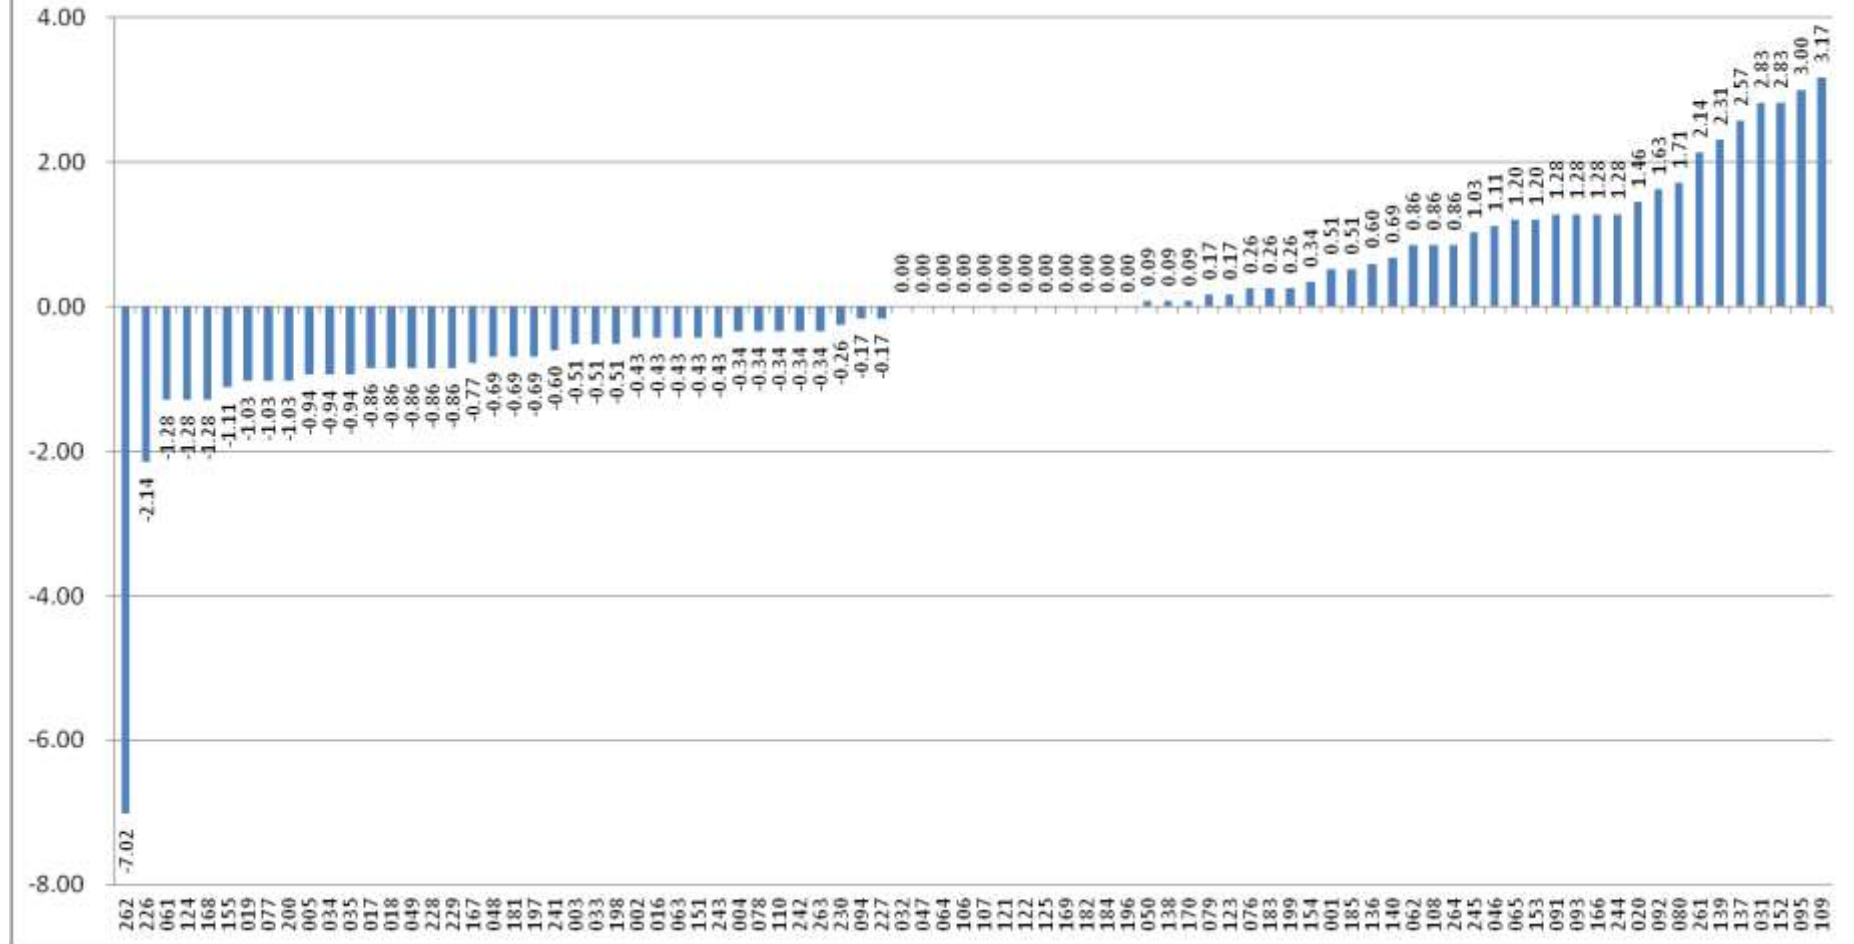

z比分数直方图-项目: 胶砂流动度 样品: C样

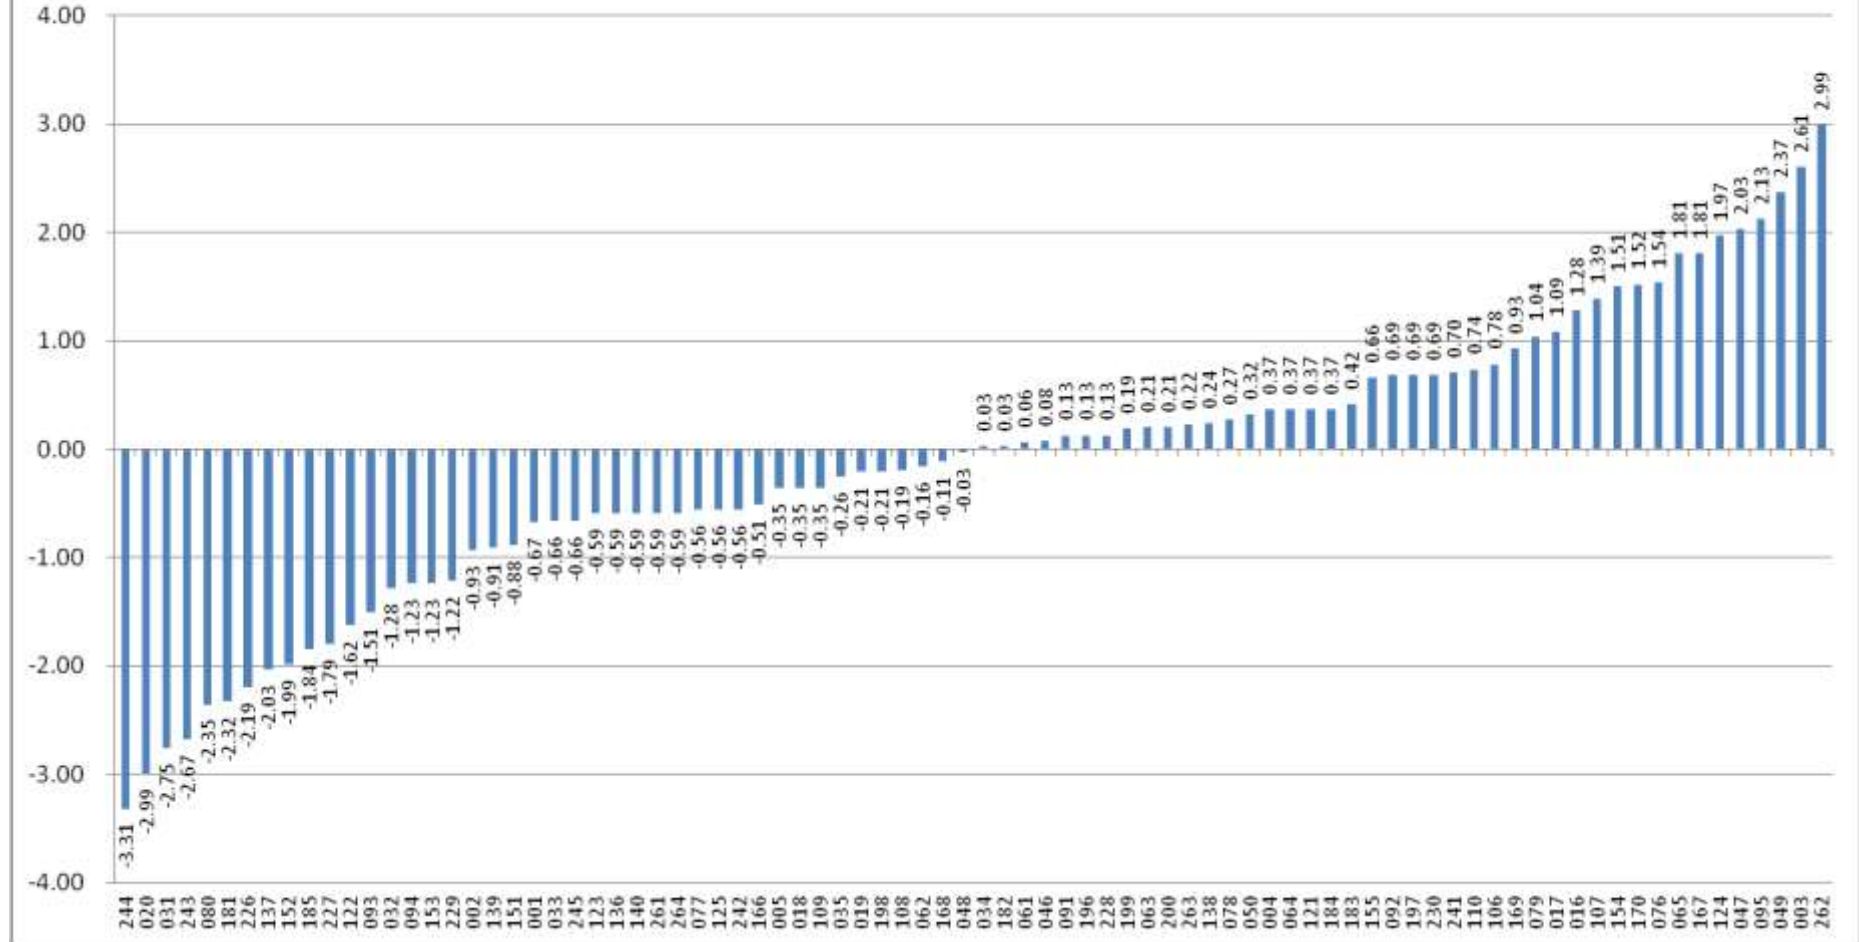

z比分数直方图-项目: 3天抗折强度 样品: C样



z比分数直方图-项目: 3天抗压强度 样品: C样

